PROYECTO: 25023

TAILINGS STORAGE FACILITIES PHASE IX


ETAPA: CONSTRUCCION – 105

4620003289

CRECIMIENTO PRESA DE RELAVES COTA 4180 - MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MANEJO DE AGUAS TSF SIDEHILL

PETS: MUESTREO DE ÁRIDOS Y CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE CON CARGADOR FRONTAL Y/O RETROEXCAVADORA

105-25023-4620003289-PET-430-H-0032



VP: Ingeniería y Proyectos
AFE: 25023

				OHLA Perú OSCAR IVAN GARCÍA TALLEDO Jefe de SSOMA - CIP 106023 Fase IX y SideHill	OHLA Perú JOSE MIGUEL CABELLO PACHECO GERENTE DE PROYECTOS Fase IX y SideHill
00	28/05/2026	**Jefe de Calidad** Johan Lomparte	**Residente de Obra** Ricardo A. Echegaray Nuñez	**Jefe de SSOMA** Oscar Garcia	**Gerente de Proyecto** José M. Cabello Pacheco
Rev.	**Fecha**	**Elaborado Por**	**Revisado Por**	**Revisado Por**	**Aprobado Por**

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

Johan Antonio Lomparte Cabanillas

De: Muñoz Cuenca, Henry Nestor <hmunoz@antamina.com>
Enviado el: domingo, 31 de mayo de 2026 08:22
Para: Zarate Portilla, Jhonatan; A_Portafolio Proy Safety
CC: Alan Osver Castillo Arevalo; Jose Miguel Cabello Pacheco; Miguel Angel Flores Siancas; Eder Macedo; Johan Antonio Lomparte Cabanillas; Oscar Ivan Garcia Talledo; Ayde Olibety Rada Fructus; Jhanina Ordonez; Llanos Barragan, Gilbert; Romainville Bejar, Ronal
Asunto: RE: PETS LABORATORIO ASFALTO - CO-PE-1PE333-PET-032_0 Muestreo de Áridos y Concreto Asfáltico en Caliente

Estimado Jhonatan:

Conforme con el PETS
OHLA debe realizar la OPT al inicio de la actividad

Saludos,

Henry Muñoz Cuenca
Ingeniero de Seguridad Industrial
Vicepresidencia de Ingeniería y Proyectos
Compañía Minera Antamina S.A.
Telf. (511) 217-3000
Cel. 962663472
hmunoz@antamina.com
www.antamina.com

From: Zarate Portilla, Jhonatan <jzarate@antamina.com>
Sent: Saturday, May 30, 2026 9:52 PM
To: Muñoz Cuenca, Henry Nestor <hmunoz@antamina.com>; A_Portafolio Proy Safety <A_PortafolioProySafety@antamina.com>; A_Safety Ingenieria y Proyectos <safetyip@antamina.com>
Cc: Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>; Jose Miguel Cabello Pacheco <jmcabello@ohla-peru.pe>; Miguel Angel Flores Siancas <miguel.flores@ohla-peru.pe>; Macedo, Eder <eder.macedo@ausenco.com>; Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>; OHLA: Garcia, Oscar <oscarivan.garcia@ohla-peru.pe>; Ayde Olibety Rada Fructus <ayde.rada@ohla-peru.pe>; Jhanina Ordonez <jhanina.ordonez@ausenco.com>; Llanos Barragan, Gilbert <gllanos@antamina.com>
Subject: RE: PETS LABORATORIO ASFALTO - CO-PE-1PE333-PET-032_0 Muestreo de Áridos y Concreto Asfáltico en Caliente

Estimado Henry,
Por favor tu soporte con la revisión al Pets adjunto el cual ya cuenta con las observaciones corregidas.

Gracias por el apoyo.

Saludos,
Jhonatan I. Zárate Portilla
Ingeniería & Proyectos
Compañia Minera Antamina S.A.
Telf. (511) 217- 3000 Anexo 6918
Cel. 945442032
jzarate@antamina.com
www.antamina.com

From: Jhanina Ordonez <Jhanina.Ordonez@ausenco.com>
Sent: Friday, May 29, 2026 5:19 PM
To: Zarate Portilla, Jhonatan <jzarate@antamina.com>; Llanos Barragan, Gilbert <gllanos@antamina.com>
Cc: Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>; Jose Miguel Cabello Pacheco <jmcabello@ohla-peru.pe>;

Miguel Angel Flores Siancas <miguel.flores@ohla-peru.pe>; Macedo, Eder <eder.macedo@ausenco.com>; Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>; OHLA: Garcia, Oscar <oscarivan.garcia@ohla-peru.pe>; Ayde Olibety Rada Fructus <ayde.rada@ohla-peru.pe>
Subject: PETS LABORATORIO ASFALTO - CO-PE-1PE333-PET-032_0 Muestreo de Áridos y Concreto Asfáltico en Caliente

Estimado Ing. Jonathan

Las observaciones ya fueron levantadas.
Favor su soporte para continuar con el flujo de aprobación de CO-PE-1PE333-PET-032_0 Muestreo de Áridos y Concreto Asfáltico en Caliente

Pets relacionado a trabajos en planta de Asfalto

Saludos;

Jhanina Ordonez | Field Civil Engineer, Intermediate
Ausenco | ausenco.com

De: Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>
Enviado el: jueves, 28 de mayo de 2026 18:44
Para: Jhanina Ordonez <Jhanina.Ordonez@ausenco.com>; Eder Macedo <Eder.Macedo@ausenco.com>
CC: Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>; Jose Miguel Cabello Pacheco <jmcabello@ohla-peru.pe>; Miguel Angel Flores Siancas <miguel.flores@ohla-peru.pe>; Oscar Ivan Garcia Talledo <oscarivan.garcia@ohla-peru.pe>; Ayde Olibety Rada Fructus <ayde.rada@ohla-peru.pe>
Asunto: RV: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX - PET-430-H-PETS 32 _ PET-430-H-0033

Estimada Jhanina,

Se envía PETS atendiendo los comentarios realizados por Antamina, para tu revisión. El levantamiento de observación dentro del documento está escrito con texto color rojo.

- CO-PE-1PE333-PET-032_0 Muestreo de Áridos y Concreto Asfáltico en Caliente

Cabe indicar que este documento cuenta con la revisión y aprobación de nuestra área de seguridad según correo líneas abajo.

Saludos

Johan Lomparte C.
Jefe de Calidad

OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERU
Proyecto: "Fase IX Antamina - 1PE333"
Cel.: +51 920347119
johan.lomparte@ohla-peru.pe

De: Miguel Angel Flores Siancas <miguel.flores@ohla-peru.pe>
Enviado: jueves, 28 de mayo de 2026 18:37
Para: Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>; Oscar Ivan Garcia Talledo <oscarivan.garcia@ohla-peru.pe>
Cc: Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>; Ayde Olibety Rada Fructus <ayde.rada@ohla-peru.pe>; Jose Miguel Cabello Pacheco <jmcabello@ohla-peru.pe>; Eduardo Antonio Castro Salgado <eduardo.castro@ohla-peru.pe>; Jose Miguel Cabello Pacheco <jmcabello@ohla-peru.pe>
Asunto: RE: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX - PET-430-H-PETS 32 _ PET-430-H-0033

Por parte SSO.

Conforme

Saludos

MF

De: Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>
Enviado el: jueves, 28 de mayo de 2026 18:29
Para: Miguel Angel Flores Siancas <miguel.flores@ohla-peru.pe>; Oscar Ivan Garcia Talledo <oscarivan.garcia@ohla-peru.pe>
CC: Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>; Ayde Olibety Rada Fructus <ayde.rada@ohla-peru.pe>; Jose Miguel Cabello Pacheco <jmcabello@ohla-peru.pe>; Eduardo Antonio Castro Salgado <eduardo.castro@ohla-peru.pe>; Jose Miguel Cabello Pacheco <jmcabello@ohla-peru.pe>
Asunto: RV: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX - PET-430-H-PETS 32 _ PET-430-H-0033

Estimado Miguel,

Favor tu revisión al siguiente PETS el cual atiende las observaciones realizadas por Antamina.

- CO-PE-1PE333-PET-032_0 Mustreo de Áridos y Concreto Afaltico en Caliente

Quedo atento
Saludos

Johan Lomparte C.
Jefe de Calidad

OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERU
Proyecto: "Fase IX Antamina - 1PE333"
Cel.: +51 920347119
johan.lomparte@ohla-peru.pe

De: Muñoz Cuenca, Henry Nestor <hmunoz@antamina.com>
Enviado: jueves, 28 de mayo de 2026 9:14
Para: Llanos Barragan, Gilbert <gllanos@antamina.com>; Vásquez Portal, José <jvasquezp@antamina.com>
Cc: Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>; Miguel Angel Flores Siancas <miguel.flores@ohla-peru.pe>; Vásquez Portal, José <jvasquezp@antamina.com>; Jhanina Ordonez <jhanina.ordonez@ausenco.com>; Eder Macedo <eder.macedo@ausenco.com>; A_Portafolio Proy Safety <A_PortafolioProySafety@antamina.com>
Asunto: RE: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX - PET-430-H-PETS 32 _ PET-430-H-0033

No suele recibir correo electrónico de hmunoz@antamina.com. Por qué es esto importante
Gilbert:

PETS 032: Con comentarios
PETS 033: Conforme
OHLA debe realizar la OPT al inicio de cada avtividad

Saludos,

Henry Muñoz Cuenca
Ingeniero de Seguridad Industrial
Vicepresidencia de Ingeniería y Proyectos
Compañía Minera Antamina S.A.
Telf. (511) 217-3000
Cel. 962663472
hmunoz@antamina.com
www.antamina.com

From: Llanos Barragan, Gilbert <gllanos@antamina.com>
Sent: Wednesday, May 27, 2026 11:46 AM
To: Vásquez Portal, José <jvasquezp@antamina.com>; Muñoz Cuenca, Henry Nestor <hmunoz@antamina.com>
Cc: Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>; Miguel Angel Flores Siancas <miguel.flores@ohla-peru.pe>; Vásquez Portal, José <jvasquezp@antamina.com>; Jhanina Ordonez <jhanina.ordonez@ausenco.com>; Macedo, Eder <eder.macedo@ausenco.com>
Subject: FW: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX - PET-430-H-PETS 32 _ PET-430-H-0033

Jose n/ Henry
Por favor Validar los PETS adjuntos.

Saludos
Gilbert Llanos Barragán
Supervisor Senior de Construcción
Gerencia de Ingeniería & Proyectos - Mina
Compañía Minera Antamina S.A.
Telf. (51-1) 217-3000 anexo 3458 - RPM #995198536
gllanos@antamina.com
www.antamina.com

From: Eder Macedo <Eder.Macedo@ausenco.com>
Sent: Tuesday, May 26, 2026 7:46 PM
To: Llanos Barragan, Gilbert <gllanos@antamina.com>
Cc: Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>; Miguel Angel Flores Siancas <miguel.flores@ohla-peru.pe>; Vásquez Portal, José <jvasquezp@antamina.com>; Jhanina Ordonez <jhanina.ordonez@ausenco.com>
Subject: RV: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX - PET-430-H-PETS 32 _ PET-430-H-0033

Estimado Gilbert,

Se adjuntan PETS con el levantamiento de observaciones.

Tu apoyo en continuar con el flujo de aprobación.

Saludos

Eder Macedo | Field Civil Engineer, Senior
Ausenco | ausenco.com

De: Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>
Enviado el: martes, 26 de mayo de 2026 19:38
Para: Jhanina Ordonez <Jhanina.Ordonez@ausenco.com>; Eder Macedo <Eder.Macedo@ausenco.com>
CC: Antonio Ramos Nuñez <aramos@ohla-peru.pe>; Ricardo Alonso Echegaray Nuñez <rechegaray@ohla-peru.pe>; Ayde Olibety Rada Fructus <ayde.rada@ohla-peru.pe>; Eduardo Antonio Castro Salgado <eduardo.castro@ohla-peru.pe>; Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>; Miguel Angel Flores Siancas <miguel.flores@ohla-peru.pe>; Oscar Ivan Garcia Talledo <oscarivan.garcia@ohla-peru.pe>
Asunto: RE: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX - PET-430-H-PETS 32 _ PET-430-H-0033

Estimado Eder,

Se envía en adjunto los PETS que ya cuentan con la aprobación de nuestra área de seguridad. Se han tomado en consideración las observaciones mencionadas en los PETS anteriores.

- CO-PE-1PE333-PET-032_0 Muestreo de Áridos y Concreto Asfáltico en Caliente
- CO-PE-1PE333-PET-033_0 Muestreo y Ensayo de Penetración

Saludos

Johan Lomparte C.
Jefe de Calidad

OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERU
Proyecto: "Fase IX Antamina - 1PE333"
Cel.: +51 920347119
johan.lomparte@ohla-peru.pe

De: Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>
Enviado: jueves, 21 de mayo de 2026 11:33
Para: Jhanina Ordonez <jhanina.ordonez@ausenco.com>; Eder Macedo <eder.macedo@ausenco.com>
Cc: Antonio Ramos Nuñez <aramos@ohla-peru.pe>; Ricardo Alonso Echegaray Nuñez <rechegaray@ohla-peru.pe>; Victor Zavaleta <Victor.Zavaleta@ausenco.com>; Ronald Ortiz <Ronald.Ortiz@ausenco.com>; Ayde Olibety Rada Fructus <ayde.rada@ohla-peru.pe>; Eduardo Antonio Castro Salgado <eduardo.castro@ohla-peru.pe>
Asunto: RV: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX - PET-430-H-PETS 32 _ PET-430-H-0033

Estimado Eder buen día,

Favor tu soporte para la atención de los PETS enviados con el levantamiento de observaciones.

Saludos

Johan Lomparte C.

Jefe de Calidad

OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERU

Proyecto: "Fase IX Antamina - 1PE333"

Cel.: +51 920347119

johan.lomparte@ohla-peru.pe

De: Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>
Enviado: domingo, 17 de mayo de 2026 15:31
Para: Jhanina Ordonez <Jhanina.Ordonez@ausenco.com>; Pablo Vladimir Rodriguez Sanchez <pablo.rodriguez@ohla-peru.pe>
Cc: Antonio Ramos Nuñez <aramos@ohla-peru.pe>; Ricardo Alonso Echegaray Nuñez <rechegaray@ohla-peru.pe>; Eder Macedo <Eder.Macedo@ausenco.com>; Victor Zavaleta <Victor.Zavaleta@ausenco.com>; Ronald Ortiz <Ronald.Ortiz@ausenco.com>; Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>
Asunto: RE: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX - PET-430-H-PETS 32 _ PET-430-H-0033

Jhanina buenas tardes, se envía los PETs con las observaciones atendidas

Un saludo

Alan Castillo A.

Jefe de Calidad - Antamina

acastillo@ohla-peru.pe

Cel: 914340975

Obrascón Huarte Lain, SA - Sucursal del Perú

De: Jhanina Ordonez <Jhanina.Ordonez@ausenco.com>
Enviado: domingo, 17 de mayo de 2026 14:59
Para: Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>; Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>; Pablo Vladimir Rodriguez Sanchez <pablo.rodriguez@ohla-peru.pe>
Cc: Antonio Ramos Nuñez <aramos@ohla-peru.pe>; Ricardo Alonso Echegaray Nuñez <rechegaray@ohla-peru.pe>; Eder Macedo <Eder.Macedo@ausenco.com>; Victor Zavaleta <Victor.Zavaleta@ausenco.com>; Ronald Ortiz <Ronald.Ortiz@ausenco.com>
Asunto: RV: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX - PET-430-H-PETS 32 _ PET-430-H-0033

Estimado Alan, Pets

Con comentarios

Tu soporte subsanando documento

Saludos;

Jhanina Ordonez | Field Civil Engineer, Intermediate
Ausenco | ausenco.com

De: Muñoz Cuenca, Henry Nestor <hmunoz@antamina.com>
Enviado el: domingo, 17 de mayo de 2026 09:34
Para: Llanos, Gilbert <gllanos@antamina.com>
CC: Jose Miguel Cabello Pacheco <jmcabello@ohla-peru.pe>; Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>; Ricardo Alonso Echegaray Nuñez <rechegaray@ohla-peru.pe>; Israel Hernandez Zuñiga <israel.hernandez@ohla-peru.pe>; Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>; Eder Macedo <Eder.Macedo@ausenco.com>; Erick Ortiz <Erick.Ortiz@ausenco.com>; Victor Zavaleta <Victor.Zavaleta@ausenco.com>; Emerson Cerin <Emerson.Cerin@ausenco.com>; Vega Montes, Juan <jvegam@antamina.com>; Araujo, Eusebio <earaujo@antamina.com>; Manosalva Horna, Sandro <gmanosalva@antamina.com>; Ronald Ortiz <Ronald.Ortiz@ausenco.com>; Lopez, Cesar <clopezv@antamina.com>; Jhanina Ordonez <Jhanina.Ordonez@ausenco.com>; A_Safety Ingenieria y Proyectos <safetyIP@antamina.com>; Romainville, Ronal <rromainville@antamina.com>
Asunto: RE: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX - PET-430-H-PETS 32 _ PET-430-H-0033

Gilbert:

Adjunto PETS con comentarios

Saludos,

Henry Muñoz Cuenca

Ingeniero de Seguridad Industrial

Vicepresidencia de Ingeniería y Proyectos

Compañía Minera Antamina S.A.

Telf. (511) 217-3000

Cel. 962663472

hmunoz@antamina.com

www.antamina.com

From: Llanos Barragan, Gilbert <gllanos@antamina.com>
Sent: Saturday, May 16, 2026 1:48 PM
To: Muñoz Cuenca, Henry Nestor <hmunoz@antamina.com>
Cc: Jose Miguel Cabello Pacheco <jmcabello@ohla-peru.pe>; Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>; Ricardo Alonso Echegaray Nuñez <rechegaray@ohla-peru.pe>; Israel Hernandez Zuñiga <israel.hernandez@ohla-peru.pe>; Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>; Macedo, Eder <eder.macedo@ausenco.com>; Erick Ortiz <erick.ortiz@ausenco.com>; Zavaleta, Victor <victor.zavaleta@ausenco.com>; Emerson Cerin <Emerson.Cerin@ausenco.com>; Vega Montes, Juan <jvegam@antamina.com>; Araujo Aguedo, Eusebio <earaujo@antamina.com>; Manosalva Horna, Sandro <gmanosalva@antamina.com>; Ronald Ortiz <Ronald.Ortiz@ausenco.com>; Lopez Vega, Cesar <clopezv@antamina.com>; Jhanina Ordonez <jhanina.ordonez@ausenco.com>
Subject: FW: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX - PET-430-H-PETS 32 _ PET-430-H-0033

Henry

Por favor tu apoyo para validar los PETS adjunto los mismo que no tiene observaciones por parte de construcción.

Saludos

Gilbert Llanos Barragán

Supervisor Senior de Construcción

Gerencia de Ingeniería & Proyectos - Mina

Compañía Minera Antamina S.A.

Telf. (51-1) 217-3000 anexo 3458 - RPM #995198536

gllanos@antamina.com

www.antamina.com

From: Jhanina Ordonez <Jhanina.Ordonez@ausenco.com>
Sent: Saturday, May 16, 2026 6:42 AM
To: Llanos Barragan, Gilbert <gllanos@antamina.com>
Cc: Jose Miguel Cabello Pacheco <jmcabello@ohla-peru.pe>; Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>; Ricardo Alonso Echegaray Nuñez <rechegaray@ohla-peru.pe>; Israel Hernandez Zuñiga <israel.hernandez@ohla-peru.pe>; Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>; Macedo, Eder <eder.macedo@ausenco.com>; Erick Ortiz <erick.ortiz@ausenco.com>; Zavaleta, Victor <victor.zavaleta@ausenco.com>; Emerson Cerin <Emerson.Cerin@ausenco.com>; Vega Montes, Juan <jvegam@antamina.com>; Araujo Aguedo, Eusebio <earaujo@antamina.com>; Manosalva Horna, Sandro <gmanosalva@antamina.com>; Ronald Ortiz <Ronald.Ortiz@ausenco.com>; Lopez Vega, Cesar <clopezv@antamina.com>
Subject: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX - PET-430-H-PETS 32 _ PET-430-H-0033

Estimado Ing. Gilber buen dia;

Favor su acostumbrado apoyo con el flujo revisión del siguiente PETS, asociado a los trabajos de laboratorio de Planta de asfalto

PET-430-H-PETS 32 : MUESTREO DE ÁRIDOS Y CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE CON CARGADOR FRONTAL Y/O RETROEXCAVADORA

PET-430-H-0033: Muestreo y Ensayo de Penetración

Por parte de supervisión no se tiene mayores observaciones

Saludos;

Jhanina Ordonez | Field Civil Engineer, Intermediate
Ausenco | ausenco.com

De: Jhanina Ordonez
Enviado el: viernes, 15 de mayo de 2026 21:36
Para: Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>; Emerson Cerin <Emerson.Cerin@ausenco.com>
CC: Jose Miguel Cabello Pacheco <jmcabello@ohla-peru.pe>; Oscar Ivan Garcia Talledo <oscarivan.garcia@ohla-peru.pe>; Ricardo Alonso Echegaray Nuñez <rechegaray@ohla-peru.pe>; Israel Hernandez Zuñiga <israel.hernandez@ohla-peru.pe>; Wendy Gutierrez Salluca <wendy.gutierrez@ohla-peru.pe>; Raul Francisco Achachau Ayquipa <raul.achachau@ohla-peru.pe>; Daniel Ruiz Rafael <daniel.ruizr@ohla-peru.pe>; Javier Augusto Rupay Beramendi <javier.rupay@ohla-peru.pe>; Victor Alex Ramos Quispe <victor.ramos@ohla-peru.pe>; Alex Franklin Alfaro Castillo <alex.alfaro@ohla-peru.pe>; Felix Javier Arias Vela <javier.arias@ohla-peru.pe>; Ayde Olibety Rada Fructus <ayde.rada@ohla-peru.pe>; Mario Eliseo Lopez Vega <mario.lopez@ohla-peru.pe>; Juvenal Contreras Monroy <juvenal.contreras@ohla-peru.pe>; Miguel Angel Flores Siancas <miguel.flores@ohla-peru.pe>; Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>; Eder Macedo <Eder.Macedo@ausenco.com>; Erick Ortiz <Erick.Ortiz@ausenco.com>; Victor Zavaleta <Victor.Zavaleta@ausenco.com>; Llanos, Gilbert <gllanos@antamina.com>
Asunto: RE: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX

Estimado Alan

Pets con Observaciones puntuales

PETS 32 : MUESTREO DE ÁRIDOS Y CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE CON CARGADOR FRONTAL Y/O RETROEXCAVADORA

Saludos;

Jhanina Ordonez | Field Civil Engineer, Intermediate
Ausenco | ausenco.com

De: Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>
Enviado el: jueves, 14 de mayo de 2026 06:45
Para: Eder Macedo <Eder.Macedo@ausenco.com>; Emerson Cerin <Emerson.Cerin@ausenco.com>; Jhanina Ordonez <Jhanina.Ordonez@ausenco.com>
CC: Jose Miguel Cabello Pacheco <jmcabello@ohla-peru.pe>; Oscar Ivan Garcia Talledo <oscarivan.garcia@ohla-peru.pe>; Ricardo Alonso Echegaray Nuñez <rechegaray@ohla-peru.pe>; Israel Hernandez Zuñiga <israel.hernandez@ohla-peru.pe>; Wendy Gutierrez Salluca <wendy.gutierrez@ohla-peru.pe>; Raul Francisco Achachau Ayquipa <raul.achachau@ohla-peru.pe>; Daniel Ruiz Rafael <daniel.ruizr@ohla-peru.pe>; Javier Augusto Rupay Beramendi <javier.rupay@ohla-peru.pe>; Victor Alex Ramos Quispe <victor.ramos@ohla-peru.pe>; Alex Franklin Alfaro Castillo <alex.alfaro@ohla-peru.pe>; Felix Javier Arias Vela <javier.arias@ohla-peru.pe>; Ayde Olibety Rada Fructus <ayde.rada@ohla-peru.pe>; Mario Eliseo Lopez Vega <mario.lopez@ohla-peru.pe>; Juvenal Contreras Monroy <juvenal.contreras@ohla-peru.pe>; Miguel Angel Flores Siancas <miguel.flores@ohla-peru.pe>; Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>
Asunto: RE: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX

Estimados buen día, se envía PETS-032 con observaciones atendidas para su revisión y/o validación.

Un saludo

OHLA Perú

Alan Castillo A.

Jefe de Calidad - Antamina

acastillo@ohla-peru.pe

Cel: 914340975

Obrascón Huarte Lain, SA - Sucursal del Perú

De: Eder Macedo <Eder.Macedo@ausenco.com>
Enviado: domingo, 10 de mayo de 2026 17:49
Para: Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>; Emerson Cerin <Emerson.Cerin@ausenco.com>; Jhanina Ordonez <Jhanina.Ordonez@ausenco.com>
Cc: Jose Miguel Cabello Pacheco <jmcabello@ohla-peru.pe>; Oscar Ivan Garcia Talledo <oscarivan.garcia@ohla-peru.pe>; Ricardo Alonso Echegaray Nuñez <rechegaray@ohla-peru.pe>; Cristian Cueto Anuarbe <ccueto@ohla-peru.pe>; Israel Hernandez Zuñiga <israel.hernandez@ohla-peru.pe>; Wendy Gutierrez Salluca <wendy.gutierrez@ohla-peru.pe>; Raul Francisco Achachau Ayquipa <raul.achachau@ohla-peru.pe>; Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>; Daniel Ruiz Rafael <daniel.ruizr@ohla-peru.pe>; Javier Augusto Rupay Beramendi <javier.rupay@ohla-peru.pe>; Kiara Beatris Liza Segura <kiara.liza@ohla-peru.pe>; Victor Alex Ramos Quispe <victor.ramos@ohla-peru.pe>; Carlos E. Anton Yacila <canton@ohla-peru.pe>; Alex Franklin Alfaro Castillo <alex.alfaro@ohla-peru.pe>; Felix Javier Arias Vela <javier.arias@ohla-peru.pe>; Ayde Olibety Rada Fructus <ayde.rada@ohla-peru.pe>; Mario Eliseo Lopez Vega <mario.lopez@ohla-peru.pe>; Juvenal Contreras Monroy <juvenal.contreras@ohla-peru.pe>; Jose Miguel Cabello Pacheco <jmcabello@ohla-peru.pe>; Miguel Angel Flores Siancas <miguel.flores@ohla-peru.pe>; Oscar Ivan Garcia Talledo <oscarivan.garcia@ohla-peru.pe>
Asunto: RE: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX

> No suele recibir correo electrónico de eder.macedo@ausenco.com. Por qué es esto importante

Estimado Johan,

Se adjunta el primer pets con observaciones.

Saludos

Eder Macedo | Field Civil Engineer, Senior
Ausenco | ausenco.com

De: Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>
Enviado el: domingo, 10 de mayo de 2026 08:45
Para: Eder Macedo <Eder.Macedo@ausenco.com>; Emerson Cerin <Emerson.Cerin@ausenco.com>; Jhanina Ordonez <Jhanina.Ordonez@ausenco.com>
CC: Jose Miguel Cabello Pacheco <jmcabello@ohla-peru.pe>; Oscar Ivan Garcia Talledo <oscarivan.garcia@ohla-peru.pe>; Ricardo Alonso Echegaray Nuñez <rechegaray@ohla-peru.pe>; Cristian Cueto Anuarbe <ccueto@ohla-peru.pe>; Israel Hernandez Zuñiga <israel.hernandez@ohla-peru.pe>; Wendy Gutierrez Salluca

<wendy.gutierrez@ohla-peru.pe>; Raul Francisco Achachau Ayquipa <raul.achachau@ohla-peru.pe>; Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>; Daniel Ruiz Rafael <daniel.ruizr@ohla-peru.pe>; Javier Augusto Rupay Beramendi <javier.rupay@ohla-peru.pe>; Kiara Beatris Liza Segura <kiara.liza@ohla-peru.pe>; Victor Alex Ramos Quispe <victor.ramos@ohla-peru.pe>; Carlos E. Anton Yacila <canton@ohla-peru.pe>; Alex Franklin Alfaro Castillo <alex.alfaro@ohla-peru.pe>; Felix Javier Arias Vela <javier.arias@ohla-peru.pe>; Ayde Olibety Rada Fructus <ayde.rada@ohla-peru.pe>; Mario Eliseo Lopez Vega <mario.lopez@ohla-peru.pe>; Juvenal Contreras Monroy <juvenal.contreras@ohla-peru.pe>; Jose Miguel Cabello Pacheco <jmcabello@ohla-peru.pe>; Miguel Angel Flores Siancas <miguel.flores@ohla-peru.pe>; Oscar Ivan Garcia Talledo <oscarivan.garcia@ohla-peru.pe>
Asunto: RE: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX

Estimado Eder buen día,

En adjunto envío los PETS en PDF y el correo de confirmación de nuestra área de Seguridad.

Los PETS para revisión son los siguientes:

- CO-PE-1PE333-PET-032_0 Muestreo de Áridos y Concreto Asfaltico en Caliente
- CO-PE-1PE333-PET-033_0 Muestreo y Ensayo de Penetración
- CO-PE-1PE333-PET-034_0 Secado de Muestras en Cocina Industrial
- CO-PE-1PE333-PET-035_0 Peso Específico Aparente y Peso Unitario de Muestras Asfálticas
- CO-PE-1PE333-PET-036_0 Extracción de Muestra de Asfalto Compactado
- CO-PE-1PE333-PET-037_0 Extracción de Cuantitativa de Asfalto en mezclas para Pavimentos

Quedamos atentos

Saludos

Johan Lomparte C.

Jefe de Calidad

OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERU

Proyecto: "Fase IX Antamina - 1PE333"

Cel.: +51 920347119

johan.lomparte@ohla-peru.pe

De: Eder Macedo <Eder.Macedo@ausenco.com>
Enviado: sábado, 9 de mayo de 2026 17:57
Para: Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>; Emerson Cerin <Emerson.Cerin@ausenco.com>; Jhanina Ordonez <Jhanina.Ordonez@ausenco.com>
Cc: Jose Miguel Cabello Pacheco <jmcabello@ohla-peru.pe>; Oscar Ivan Garcia Talledo <oscarivan.garcia@ohla-peru.pe>; Ricardo Alonso Echegaray Nuñez <rechegaray@ohla-peru.pe>; Cristian Cueto Anuarbe <ccueto@ohla-peru.pe>; Israel Hernandez Zuñiga <israel.hernandez@ohla-peru.pe>; Wendy Gutierrez Salluca <wendy.gutierrez@ohla-peru.pe>; Raul Francisco Achachau Ayquipa <raul.achachau@ohla-peru.pe>; Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>; Daniel Ruiz Rafael <daniel.ruizr@ohla-peru.pe>; Javier Augusto Rupay Beramendi <javier.rupay@ohla-peru.pe>; Kiara Beatris Liza Segura <kiara.liza@ohla-peru.pe>; Victor Alex Ramos Quispe <victor.ramos@ohla-peru.pe>; Carlos E. Anton Yacila <canton@ohla-peru.pe>; Alex Franklin Alfaro Castillo <alex.alfaro@ohla-peru.pe>; Felix Javier Arias Vela <javier.arias@ohla-peru.pe>; Ayde Olibety Rada Fructus <ayde.rada@ohla-peru.pe>; Mario Eliseo Lopez Vega <mario.lopez@ohla-peru.pe>; Juvenal Contreras Monroy <juvenal.contreras@ohla-peru.pe>; Juvenal Contreras Monroy <juvenal.contreras@ohla-peru.pe>
Asunto: RE: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX

CORREO EXTERNO: Comprueba el remitente y no pulses los enlaces ni los adjuntos si dudas que sean seguros.
EXTERNAL EMAIL: Check the sender and do not click any link or attachment unless you are sure they are safe.

Estimado Johan,

La información de los PETS previamente tiene que ser revisada y validada por SSOMA OHLA, posterior a ello nos envías los documentos adjuntando el correo de aprobación por parte de SSOMA OHLA.

Adjuntar pets en pdf.

Quedamos al pendiente para la revisión.

Saludos

Eder Macedo | Field Civil Engineer, Senior
Ausenco | ausenco.com

De: Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>
Enviado el: sábado, 9 de mayo de 2026 16:50
Para: Emerson Cerin <Emerson.Cerin@ausenco.com>; Eder Macedo <Eder.Macedo@ausenco.com>; Jhanina Ordonez <Jhanina.Ordonez@ausenco.com>
CC: Jose Miguel Cabello Pacheco <jmcabello@ohla-peru.pe>; Oscar Ivan Garcia Talledo <oscarivan.garcia@ohla-peru.pe>; Ricardo Alonso Echegaray Nuñez <rechegaray@ohla-peru.pe>; Cristian Cueto Anuarbe <ccueto@ohla-peru.pe>; Israel Hernandez Zuñiga <israel.hernandez@ohla-peru.pe>; Wendy Gutierrez Salluca <wendy.gutierrez@ohla-peru.pe>; Raul Francisco Achachau Ayquipa <raul.achachau@ohla-peru.pe>; Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>; Daniel Ruiz Rafael <daniel.ruizr@ohla-peru.pe>; Javier Augusto Rupay Beramendi <javier.rupay@ohla-peru.pe>; Kiara Beatris Liza Segura <kiara.liza@ohla-peru.pe>; Victor Alex Ramos Quispe <victor.ramos@ohla-peru.pe>; Carlos E. Anton Yacila <canton@ohla-peru.pe>; Alex Franklin Alfaro Castillo <alex.alfaro@ohla-peru.pe>; Felix Javier Arias Vela <javier.arias@ohla-peru.pe>; Ayde Olibety Rada Fructus <ayde.rada@ohla-peru.pe>; Mario Eliseo Lopez Vega <mario.lopez@ohla-peru.pe>; Juvenal Contreras Monroy <juvenal.contreras@ohla-peru.pe>; Juvenal Contreras Monroy <juvenal.contreras@ohla-peru.pe>
Asunto: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX

Estimados buenas tardes.

Adjunto 06 PETS correspondientes a las actividades a desarrollar en el Laboratorio de asfalto, para su revisión y comentarios.

- CO-PE-1PE333-PET-032_0 Muestreo de Áridos y Concreto Asfaltico en Caliente
- CO-PE-1PE333-PET-033_0 Muestreo y Ensayo de Penetración
- CO-PE-1PE333-PET-034_0 Secado de Muestras en Cocina Industrial
- CO-PE-1PE333-PET-035_0 Peso Específico Aparente y Peso Unitario de Muestras Asfalticas
- CO-PE-1PE333-PET-036_0 Extracción de Muestra de Asfalto Compactado
- CO-PE-1PE333-PET-037_0 Extracción de Cuantitativa de Asfalto en Mezclas para Pavimentos

Quedamos atentos

Saludos

Johan Lomparte

OHLA
Perú

Johan Lomparte C.

Jefe de Calidad

OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERU

Proyecto: "Fase IX Antamina - 1PE333"

Cel.: +51 920347119

johan.lomparte@ohla-peru.pe

La información contenida en este e-mail es confidencial, privilegiada y está dirigida exclusivamente a su destinatario. Cualquier revisión, difusión, distribución o copiado de este mensaje está prohibido. Si ha recibido este e-mail por error por favor bórrelo y envíe un mensaje al remitente.

The information contained in this e-mail is privileged and confidential and is intended only for its addressee. Any review, dissemination, distribution or copying of this e-mail is prohibited. If you have received it in error please delete the original message and e-mail us.

La información contenida en este e-mail es confidencial, privilegiada y está dirigida exclusivamente a su destinatario. Cualquier revisión, difusión, distribución o copiado de este mensaje está prohibido. Si ha recibido este e-mail por error por favor bórrelo y envíe un mensaje al remitente.

The information contained in this e-mail is privileged and confidential and is intended only for its addressee. Any review, dissemination, distribution or copying of this e-mail is prohibited. If you have received it in error please delete the original message and e-mail us.

La información contenida en este e-mail es confidencial, privilegiada y está dirigida exclusivamente a su destinatario. Cualquier revisión, difusión, distribución o copiado de este mensaje está prohibido. Si ha recibido este e-mail por error por favor bórrelo y envíe un mensaje al remitente.

The information contained in this e-mail is privileged and confidential and is intended only for its addressee. Any review, dissemination, distribution or copying of this e-mail is prohibited. If you have received it in error please delete the original message and e-mail us.

CO - PE - 1PE333 - SS - PE - 032

PETS: Muestreo de áridos y concreto asfáltico en caliente con cargador frontal y/o retroexcavadora

Preparado por	Revisado por	Revisado por	Aprobado por
Jefe de Calidad	Residente de obra	Jefe de SSOMA	Gerente de proyecto
Johan Lomparte 28/05/2026	Ricardo A. Echegaray Nuñez 28/05/2026	Oscar Garcia, 28/05/2026	Jose M. Cabello Pacheco, 28/05/2026

OHLA Perú
OSCAR IVAN GARCÍA TALLEDO
Jefe de SSOMA - CIP 106023
Fase IX y SideHill

OHLA Perú
JOSE MIGUEL CABELLO PACHECO
GERENTE DE PROYECTOS
Fase IX y Side Hill

Nivel de seguridad:
Uso interno

Alcance:
FASE IX 4180 ANTAMINA

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

Histórico de revisiones

Rev.00	28/05/2026	Creación del documento

Documentación relacionada y aplicable

ISO 45001	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
----	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADA SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD
-----	REQUISITOS LEGALES VIGENTES
D.S 024-2016-EM	REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN MINERIA
D.S 023-2027-EM	Modificatoria del D.S-024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en minería

Definiciones

MEZCLA ASFALTICA:	Se denomina como mezcla asfáltica a la combinación de áridos con un ligante (PEN).
AGREGADOS:	Material estará compuesto de gravas y arenas procesadas no plásticas, conformadas por partículas duras y durables y sin material orgánico, contenido de arcillas, partículas blandas, o cualquier otro material inadecuado. El material deberá cumplir con las características asociadas a la categoría geoquímica C de Antamina según la Tabla 1 de la Especificación Técnica 430-C-0020_Colocación de Rellenos.

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

Matriz del Conocimiento

CATEGORÍA	FUNCIONES
☐ Todas las categorías	☐ Todas las funciones
☐ Consejero delegado	☐ Asesoría Jurídica
☐ Directores Generales	☐ Económico Financiera
☐ Dirección General	☐ Organización
☐ Director Corporativo	☐ RR.HH y SSGG
☐ Director	☐ Sistemas de Información
☐ Jefe Corporativo de	☐ Soporte Corporativo
☒ Jefe de Producción	☒ Soporte Técnico
☒ Técnico	☐ Línea/Producción
☐ Especialista	☐ Otros:.....
☐ Administrativo	
☒ Operario cualificado	

Responsable de distribución: Responsable de Construcción

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

ÍNDICE

1. PERSONAL 6
1.1. Gerente de Proyecto. 6
1.2. Ingeniero / Supervisor de campo 6
1.3. Ingeniero de Seguridad y Salud en el trabajo 7
1.4. Jefe de laboratorio 7
1.5. Jefe de Planta de Asfalto 7
1.6. Supervisor de Calidad 8
1.7. Técnico de Laboratorio 8
1.8. Auxiliares de Laboratorio 8
1.9. Operarios de Equipos 9
1.10. Vigía 9
2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 10
3. EQUIPO / HERRAMIENTAS / MATERIALES 10
3.1 Equipos 10
3.2 Herramientas 11
4. PROCEDIMIENTO 11
4.1 Consideraciones generales 11
4.2 Muestreo de Árido: 13
4.3 Muestreo de concreto Caliente 15
5. RESTRICCIONES 16
6. ANEXOS 16

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

1. PERSONAL

1.1. Gerente de Proyecto.

- Asignar y garantizar los recursos para el cumplimento de las actividades relacionadas al presente procedimiento.
- Responsable de la planificación, programación y seguimiento de las actividades y responsable del cumplimiento del presente procedimiento siguiendo las normas de seguridad.
- Verificar la implementación de los controles para los riesgos críticos identificadas para la tarea.
- Supervisar la correcta ejecución de las actividades de obra, según lo establecido en el presente procedimiento.
- Comprometerse con la prevención de incidentes, lesiones y enfermedades ocupacionales, promoviendo la participación de los trabajadores en el desarrollo e implementación de actividades de Seguridad y Salud Ocupacional.
- Cumplir y hacer cumplir las 10 reglas por la vida estipuladas por Antamina.

1.2. Ingeniero / Supervisor de campo

- Difundir, aplicar y hacer cumplir el presente procedimiento.
- Difundir y verificar que el personal involucrado conozca el presente procedimiento y hacer seguimiento de su cumplimiento.
- Coordinar con en el supervisor de calidad para brindar las facilidades durante el trabajo
- Reportar inmediatamente cualquier incidente o accidente.
- Usar permanentemente y de forma correcta los EPPs, así como darles el cuidado necesario.
- Parar inmediatamente el trabajo si las condiciones de este atentan contra la seguridad del personal involucrado o terceros.
- Participar activamente en la detección de posibles desviaciones, actos inseguros, condiciones inseguras, entre otras observaciones realizadas en el terreno de trabajo, lo cual deberá ser reportado oportunamente al Supervisor de Área SSOMA.
- Proporcionar los recursos necesarios para la ejecución de los trabajos.
- Reportar incidentes de forma inmediata.
- Asegurar que en su área de responsabilidad los trabajos cuenten con los permisos antes del inicio.
- Asegurar que las condiciones del área y equipos se mantengan tal como las registradas cuando se generó el permiso.
- Reportar incidentes y accidentes de forma inmediata.

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

1.3. Ingeniero de Seguridad y Salud en el trabajo

- Auditar y asesorar el llenado y cumplimiento de las autorizaciones (permisos) de trabajo e IPERC CONTINUO y PETAR "Trabajos en caliente" que apliquen a la actividad.
- Difundir a todo el personal involucrado el presente PETS una vez aprobado por Antamina, para su estricto cumplimiento en campo y generar la OPT de inicio de actividades.
- Cumplir las obligaciones según el Art 38 "Obligaciones de los supervisores" del DS 024-2016-EM y su modificatoria DS 023-2017.
- Revisar y firmar el IPERC-Continuo y PETAR de la tarea, asegurándose del cumplimiento de las medidas de control establecidas.
- Verificar y evaluar que el personal involucrado conozca el procedimiento de trabajo seguro, además asegurar que cuente con las autorizaciones requeridas para realizar el trabajo.
- Reportar todo incidente y accidente según el canal de comunicación en flujograma de comunicación de incidentes.

1.4. Jefe de laboratorio

- Difundir, aplicar y hacer cumplir el presente procedimiento.
- Verificar que el personal cuente con las autorizaciones requeridas para operar los equipos de laboratorio (capacitación específica según marca y tipo)
- Proporcionar los recursos de seguridad necesarios para la ejecución de los trabajos.
- Difundir y verificar que el personal involucrado conozca el presente procedimiento y hacer seguimiento de su cumplimiento.
- Usar permanentemente y de forma correcta los EPPs, así como darles el cuidado necesario.
- Parar inmediatamente el trabajo si las condiciones de este atentan contra la seguridad del personal involucrado o terceros.
- Participar activamente en la detección de posibles desviaciones, actos inseguros, condiciones inseguras, entre otras observaciones realizadas en el terreno de trabajo, lo cual deberá ser reportado oportunamente al Supervisor de Área SSOMA.
- Reportar incidentes de forma inmediata a su supervisor inmediato.

1.5. Jefe de Planta de Asfalto

- Difundir, aplicar y hacer cumplir el presente procedimiento.
- Asegurar que sólo personal entrenado, certificado y autorizado opere equipos
- Planificar los trabajos a realizarse.
- Responsable del personal y equipos que intervienen en el trabajo a desarrollarse.
- Participa en la evaluación de riesgos de la actividad detallada en el IPERC Continuo.
- Distribuir el trabajo y velar por que las actividades se realicen de manera segura coordinando directamente con el Supervisor de Área por parte de OHLA.
- Proporcionar los recursos necesarios para la ejecución de los trabajos.

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

- Asegurar que en su área de responsabilidad los trabajos cuenten con los permisos antes del inicio.
- Asegurar que las condiciones del área y equipos se mantengan tal como las registradas cuando se generó el permiso.
- Reportar incidentes y accidentes de forma inmediata.

1.6. Supervisor de Calidad

- Conocer y cumplir el presente procedimiento.
- Verificar que el personal cuente con las autorizaciones requeridas para operar los equipos de laboratorio (capacitación específica según marca y tipo)
- Proporcionar los recursos necesarios para la ejecución de los trabajos.
- Parar inmediatamente el trabajo si las condiciones de este atentan contra la seguridad del personal involucrado o terceros.
- Usar permanentemente y de forma correcta los EPPs, así como darles el cuidado necesario.
- Participar activamente en la detección de posibles desviaciones, actos inseguros, condiciones inseguras, entre otras observaciones realizadas en el terreno de trabajo, lo cual deberá ser reportado oportunamente al Supervisor de Área SSOMA.
- Reportar inmediatamente cualquier incidente o accidente.

1.7. Técnico de Laboratorio

- Conocer y cumplir el presente procedimiento.
- Participar en la elaboración del IPERC continuo (identificación de peligros, evaluación de riesgos, y controles).
- Realizar el check list de pre-uso de los equipos y herramientas a utilizar, y de presentar algún desperfecto o falla, reportarlo y/o asignarle la tarjeta de fuera de servicio.
- Usar permanentemente y de forma correcta los EPPs, así como darles el cuidado necesario.
- Respetar la restricción de ingreso a las áreas señalizadas y delimitadas.
- Identificar puntos de atricción de manos y señalizar.
- Durante la realización de los trabajos aplicar la receta para el cuidado de manos, priorizando la N° 3 y N° 5.
- Consultar al supervisor sobre cualquier duda en la realización del trabajo.
- Reportar inmediatamente cualquier incidente o accidente.

1.8. Auxiliares de Laboratorio

- Conocer y cumplir el presente procedimiento.
- Participar en la elaboración del IPERC continuo (identificación de peligros, evaluación de riesgos, y controles).

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

- Realizar el check list de pre-uso de los equipos y herramientas a utilizar, y de presentar algún desperfecto o falla, reportarlo y/o asignarle la tarjeta de fuera de servicio.
- Mantener el área limpia y ordenada, antes, durante y después de cada actividad.
- Usar permanentemente y de forma correcta los EPPs, así como darles el cuidado necesario.
- Respetar la restricción de ingreso a las áreas señalizadas y delimitadas.
- Identificar puntos de atricción de manos y señalizar.
- Durante la realización de los trabajos aplicar la receta para el cuidado de manos, priorizando la N° 3 y N° 5.
- Consultar al supervisor sobre cualquier duda en la realización del trabajo.
- Reportar inmediatamente cualquier incidente o accidente.

1.9. Operarios de Equipos

- Conocer y cumplir el presente procedimiento.
- Cumplir de manera responsable con el programa de fatiga y somnolencia.
- Operar correcta y eficientemente el equipo de línea amarilla (cargador frontal, retroexcavadora) cumpliendo con las exigencias de manejo defensivo de la empresa y el cliente
- Participar en la elaboración del IPERC continuo (identificación de peligros, evaluación de riesgos, y controles).
- Verificar el buen estado del equipo antes del inicio de operación haciendo uso del check list, y de presentarse algún defecto o señal de alerta, reportarlo inmediatamente.
- Contar siempre con una radio interna para coordinaciones con el vigía y los supervisores, teniendo siempre una batería de respaldo a fin de mantener siempre la comunicación requerida.
- El operador nunca podrá descender del equipo con el motor encendido.
- Usar permanentemente y de forma correcta los EPP´s, así como darles el cuidado necesario.
- Contar con las certificaciones y autorizaciones requeridas para operar el equipo
- Contar con la capacitación en atención de derrames sustancias químicas.
- Consultar al supervisor sobre cualquier duda en la ejecución de la tarea
- Informar inmediatamente al supervisor, si identifica algún signo de la somnolencia.
- De presentarse una tormenta eléctrica (alerta roja), mantenerse dentro de la cabina del equipo con las puertas y ventanas cerradas.
- Reportar inmediatamente cualquier incidente o accidente.

1.10. Vigía

- Conocer y cumplir el presente procedimiento.
- Respetar la restricción de ingreso a las áreas señalizadas y delimitadas.

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

- Participa en la evaluación de riesgos de la actividad detallada en el IPERC Continuo.
- Identificar y reportar a su supervisor la falta de demarcación y/o señalización de un área.
- Reportar inmediatamente a su supervisor sobre cualquier violación o incumplimiento a las restricciones de elementos y materiales de demarcación.
- Contar con las autorizaciones necesarias para ejecutar sus actividades.
- Contar con la Capacitación, autorizado con Fotocheck y Verificar que cumpla los controles de acuerdo con el "BOLETÍN N° 07: VIGIAS DE TRANSITO y GUIAS DE DESCARGA" de I&P.
- Reportar incidentes y accidentes de forma inmediata.

2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

- Casco de Seguridad.
- Lentes de Seguridad.
- Zapatos de Seguridad.
- Chaleco Reflectivo.
- Bloqueador solar - FPS mayor o igual a 50.
- Protección auditiva - ANSI S3.19-1974.
- Ropa protectora – ANSI/ISEA 107-2005 (Elementos reflectantes para EPP).
- Respirador de media cara con Filtro 7093C para partículas P100.
- Careta facial.
- Mandil aluminizado.
- Guantes de cuero y/o aluminizado caña alta.
- Cortaviento.
- Barbiquejo

3. EQUIPO / HERRAMIENTAS / MATERIALES

3.1 Equipos

- Cargador Frontal.
- Retroexcavadora.
- Camioneta.
- Termómetro indicación digital / infrarrojo.

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

- Detector de tormentas portátil con batería adicional
- Radio portátil (Troncalizada y canal interno) con Batería de repuesto

3.2 Herramientas

- Escalera con baranda.
- Radio portátil Handy.
- Carretilla tipo bugui.
- Palanas.
- Bandejas, tazones y recipientes.

4. PROCEDIMIENTO

4.1 Consideraciones generales

- Todo el personal debe asistir a las reuniones de seguridad previas al inicio de las labores (Charla de 5 minutos).
- Identificar los controles de riesgos críticos 23 y riesgo crítico 12 que aplican para la actividad.
  - RC23 - Descarga atmosférica (rayos) y/o trabajos en zonas remotas.
    - Uso de EPP específicos en áreas remotas
    - Calibración y mantenimiento de equipos fijos y portátiles
    - Capacitación del personal en detección visual de tormentas eléctricas, niveles de alerta, uso de refugios y detectores portátiles.
    - Refugios certificados y señalizados en zonas de trabajo expuestas
    - Sistema de comunicación radial y protocolos de comunicación
    - Verificación previa de condiciones meteorológicas y operativas
    - Brigadas de respuesta a emergencia (Comunicación, equipamiento y competencia)
    - Pararrayos en áreas expuestas a descargas atmosféricas
  - RC12 – Atropello de personas por equipos o vehículos
    - Protocolo de comunicación en el área de interacción
    - Autorización de conducción
    - Mantenimiento programado de sistemas críticos para vehículos y equipos
    - Parqueo de vehículos y/o Bloqueo de equipos en mantenimiento
    - Segregación en áreas de interacción
    - Brigadas de respuesta a emergencia (Comunicación, equipamiento y competencias

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

- El personal será capacitado en la receta de cuidado de manos y línea de fuego.
- Previo al inicio de actividades, el personal deberá elaborar su IPERC continuo y PETAR de trabajos en caliente debidamente firmado por un ingeniero colegiado y habilitado.
- Verificar la disponibilidad de Equipos de Protección Personal (EPPs) y herramientas requeridas para cumplir el presente procedimiento. Antes de iniciar y durante toda la actividad se deberá usar estrictamente los EPPs, con la finalidad de minimizar los riesgos que puedan afectar a la persona.
- El supervisor del área deberá asegurar la disponibilidad de las Hojas de Datos de Seguridad (MSDS) de todos los productos químicos previo al inicio de las actividades, así como garantizar su adecuada difusión y comprensión por parte de todo el personal involucrado en la tarea. “Esta información deberá estar disponible en campo para los trabajadores, asegurando su acceso permanente. Asimismo, se deberá verificar la vigencia cada los tres (3) años desde su emisión o última actualización.”
- Las herramientas para utilizar deben encontrarse inspeccionadas (operativas), con la identificación correspondiente a la cinta de color del mes para ejecutar la actividad, si se reporta fallas no realizar la reparación de estas y eliminarlas del área de trabajo.

ROJO	ENERO-MARZO
AZUL	ABRIL-JUNIO
AMARILLO	JULIO-SETIEMBRE
NEGRO	OCTUBRE-DICIEMBRE

- Deberán de existir áreas delimitadas y señalizadas para acceso peatonal (bermas, muros y/o barandas), y para acceso vehicular (parqueo).
- Verificar que se hayan emitido los permisos correspondientes requeridos para la tarea (PETAR de trabajos en caliente).
- Verificar que el personal cumpla con las certificaciones internas requeridas para la tarea (vigía).
- Las herramientas para utilizar deben encontrarse inspeccionadas (operativas), con la identificación correspondiente a la cinta de color del mes para ejecutar la actividad, si se reporta fallas realizar la reparación de estas y/o eliminarlas del área de trabajo.
- Deberán de existir áreas delimitadas y señalizadas para acceso peatonal (bermas, muros y/o barandas), y para acceso vehicular (parqueo).
- El supervisor del área deberá proporcionar las hojas MSDS de los productos químicos antes de iniciar las actividades y realizar la difusión a todo el personal involucrado en la tarea.

“Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida”.

- Se tendrá que definir un lugar específico para la toma de muestras, donde el cargador frontal y/o retroexcavadora podrá posicionarse para realizar la tarea; el área estará señalizada y de uso exclusivo para esta actividad.
- La comunicación entre jefe de planta, operadores, vigías y personal de calidad será vía radial (radio HANDY), también utilizando el megáfono instalado en la planta.
- Capacitar al personal en línea de fuego y receta de cuidado de manos.
- El supervisor deberá aplicar los controles críticos relacionado al trabajo:
- RC12 - Atropello de personas por equipos o vehículos.
- RC23 - Descarga atmosférica (rayos) y/o trabajos en zonas remotas.
- El supervisor verificará los controles críticos para los riesgos críticos relacionados con las actividades a ejecutar en el presente procedimiento.
- El personal deberá realizar la identificación y evaluación de peligros mecánicos, tales como puntos de atrapamiento, puntos de atrición, zonas de cizallamiento y superficies cortantes. Evitando en todo momento la exposición de las manos y utilizando los elementos de protección personal adecuados como guantes antimpacto y anticorte.
- Se debe contar con refugio cercano a 100 m del área de trabajo
- Todo personal debe estar capacitado en respuesta a emergencias y uso de extintores
- Se debe contar en el área con un detector portátil de tormentas, operado por personal capacitado por el proveedor, así como con una batería de repuesto disponible.

4.2 Muestreo de Árido:

- Se solicitará al jefe de planta de asfalto que produzca una muestra de los áridos en caliente.
- El desplazamiento del cargador frontal y/o retroexcavadora se realizará bajo la supervisión de un vigía, quien se ubicará en una camioneta para guiar las maniobras de manera segura.
- Respetar el radio de trabajo del equipo:

  a. Cargador Frontal: Frontal, posterior 50 m y lateral 20 m.

  b. Retroexcavadora: Frontal, posterior 50 m y lateral 20 m.
- De acuerdo con el Boletín N° 13: Radio de Trabajo de Equipos.
- Se deberá de segregar y delimitar el área donde ejecutará la tarea dando cumplimiento a los lineamientos establecidos Boletín 012 - Uso de barreras de segregación o delimitación v.03

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

- El operador del cargador frontal o retroexcavadora se posicionará de tal forma que el cucharón quede por debajo de la compuerta de descarga de la planta de asfalto. La comunicación entre el operador de excavadora o cargador frontal y el personal de laboratorio que realizará el muestreo será por medio de Radio Comunicador Handy; se tendrá que detener el flujo de volquetes, liberando el área de descarga de material. Cabe precisar que el equipo de carguío deberá contar con protección o aislamiento en las mangueras hidráulicas y vástagos.
- Se procederá a la descarga de la mezcla global en el cucharón del cargador frontal y/o retroexcavadora, hasta alcanzar un volumen aproximado de 1.5 m^3, manteniendo una altura de descarga de 1 metro.
- Recepcionada la muestra, el cargador frontal y/o retroexcavadora bajo la indicación del vigía se retirará de la torre de descarga y se trasladará a los patios autorizados en donde acopiará la muestra, para luego retirarse hacia la zona de parqueo (abastecimiento de tolvas).
- El personal de laboratorio solicitará autorización al jefe de planta para poder transitar por las vías de acceso peatonal y/o vehicular establecidas y señalizadas, para lo cual coordinará con los vigías a fin de que detengan el flujo vehicular y de esta manera puedan realizar un libre desplazamiento hacia los patios autorizados (acopios).
- Antes de hacer la toma de muestras se deberá verificar que el personal cuente con los EPPs adecuados (guantes aluminizados de caña larga, mandiles aluminizados, respirador con filtros antigases y caretas), que soporten altas temperaturas.
- El personal de laboratorio, utilizando un termómetro digital de vástago de 30 cm de longitud, procederá a medir la temperatura de los áridos a muestrear. La temperatura de los áridos deberá encontrarse dentro del rango de 149 °C a 153 °C.
- La toma de muestra (20 kg) se realizará utilizando palas, minimizando el riesgo de contacto directo con los áridos. El material será descargado en bandejas aluminizadas, de dimensiones 80 cm × 50 cm, provistas de dos asas laterales para facilitar su manipulación. Posteriormente, las muestras serán trasladadas mediante carretilla y/o camioneta.
- Si el traslado se realiza en camioneta se realizarán los siguientes controles:

  a) Por medio del Radio comunicador Handy se solicita el permiso al Jefe de Planta, para el ingreso a la zona de toma de muestras.

  b) Colocar conos y tacos para colocar la muestra en la tolva.

  c) Retirar conos y tacos, luego pedir permiso al Jefe de Planta y/o encargado, para proseguir con su retiro este se solicita por Radio Comunicador.
- Antes de retirarse del área de muestreo el personal verificará que no deje ninguna herramienta llevada para la realización del ensayo.

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

- Por el mismo medio de Radio comunicador se informa al vigía y al jefe de la planta que la tarea de muestreo finalizó y que procederán a retirarse, esto a fin de que detengan el flujo vehicular y puedan realizar un desplazamiento seguro, para luego proseguir con sus operaciones.

4.3 Muestreo de concreto Caliente

- Se solicitará al jefe de planta de asfalto que produzca una muestra de concreto asfáltico en caliente. El mismo que autorizara el ingreso del equipo e indicara el punto de ubicación para el muestreo. Después de haber retirado a todo el personal del área.
- El desplazamiento del cargador frontal y/o retroexcavadora se realizará bajo la supervisión de un vigía, quien se ubicará en una camioneta para guiar las maniobras de manera segura
  a) Cargador Frontal: Frontal, posterior 50 m y lateral 20 m.
  b) Retroexcavadora: Frontal, posterior 50 m y lateral 20 m.
  De acuerdo con el Boletín N° 13: Radio de Trabajo de Equipos
- Se deberá de segregar y delimitar el área donde ejecutará la tarea dando cumplimiento a los lineamientos establecidos Boletín 012 - Uso de barreras de segregación o delimitación v.03
- El operador del cargador frontal y/o Retroexcavadora posicionará y estacionará su equipo en el chute de descarga del silo en caliente, bajará su cucharon, apagará su equipo, pondrá sus tacos y se dirigirá a la zona de espera evitando exponerse a las altas temperaturas y esperando que el personal de laboratorio lo requiera.
- El personal de laboratorio procederá con la toma de muestra. Antes de realizar la toma se deberá verificar que se cuente con los EPPs adecuados (guantes, mandil aluminizado), que soporten altas temperaturas, como también el uso de casco, zapatos, lentes, respirador para gases y careta.
- Posteriormente, se procederá a la toma de muestra (aproximadamente 10 kg) del concreto asfáltico en caliente. La temperatura de la mezcla deberá estar comprendida entre 144 °C y 150 °C.
- El personal de laboratorio con el uso de un termómetro infrarrojo y/o termómetro indicación digital tomará la temperatura del concreto asfáltico en caliente con la que sale de planta.
- La toma de muestra (20 kg) se realizará utilizando palas, minimizando el riesgo de contacto directo con la mezcla asfáltica en caliente. El material será descargado en bandejas aluminizadas, de dimensiones 80 cm × 50 cm, provistas de dos asas laterales para facilitar su manipulación. Posteriormente, las muestras serán trasladadas mediante carretilla y/o camioneta.
- Si el traslado se realiza en camioneta se realizarán los siguientes controles:

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

a) Solicitar el permiso al jefe de Planta, para el ingreso a la zona de toma de muestras.
b) Colocar conos y tacos para colocar la muestra en la tolva.
c) Retirar conos y tacos, luego pedir permiso al jefe de Planta y/o encargado, para proseguir con su retiro.

- Antes de retirarse del área de muestreo el personal verificará que no deje ninguna herramienta llevada para la realización del ensayo.
- Se informa al vigía y al jefe de la planta que la tarea de muestreo finalizó y que procederán a retirarse, esto a fin de que detengan el flujo vehicular y puedan realizar un desplazamiento seguro, para luego proseguir con sus operaciones.

5. RESTRICCIONES

- No se iniciarán los trabajos si el personal involucrado no ha recibido la difusión del presente PETS
- No se realizará las labores si los operadores no se encuentran calificados, y certificados por la marca o el representante de la marca de acuerdo con el modelo y marca del equipo.
- No se iniciará la toma de muestra si el equipo (cargador frontal o retroexcavadora) no se ha detenido completamente; verificar que el equipo este apagado y con la extracción de la llave de contacto.
- Se deberá verificar y asegurar que en el área de trabajo no exista la presencia de personal ajeno a la actividad.
- No se iniciará el trabajo si no se ha implementado todos los controles para los riesgos críticos
- Está prohibido el uso de celulares en horas de trabajo
- No se realizará trabajo alguno en estado de alerta ROJA emitida por el CENTRO DE CONTROL y/o alertas emitidas por los detectores portátiles.
- Se detendrá el trabajo de no cumplir con la implementación de los controles críticos
  - RC 23 Caída de Rayos -Tormentas eléctricas.
  - RC-12 Atropello de persona por equipo o vehículo en transito

6. ANEXOS

* BOLETÍN N° 001: FLUJOGRAMA EN CASO DE INCIDENTES.
* CO-PE-1PE331-SS-PA-007-Encuesta de Autoevaluación diaria de fatiga y somnolencia.
* Boletín: Receta de cuidado de manos.

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".


Boletín de Seguridad Industrial para Proyectos

Superintendencia de Seguridad Industrial para Proyectos	BOLETÍN N° 001: FLUJOGRAMA EN CASO DE INCIDENTES				Vicepresidencia de Ingeniería y Proyectos
	Elaboración: 16/11/2014	Revisión: 29/08/2025	Página: 1 de 1	Versión 3	

FLUJOGRAMA EN CASO DE INCIDENTES

Inmediatamente ocurrido un incidente, los Socios Estratégicos **deben informar** vía radial, celular y/o verbal al Supervisor de Construcción responsable en turno y al Ingeniero de Seguridad Industrial de Antamina.

Posteriormente, pero **dentro del turno de trabajo** en que ocurrió el incidente, enviar el informe preliminar y potencial vía e -mail al Supervisor de Construcción en turno con copia a **safetyIP@antamina.com**. En el siguiente esquema se detalla el flujo de comunicación:

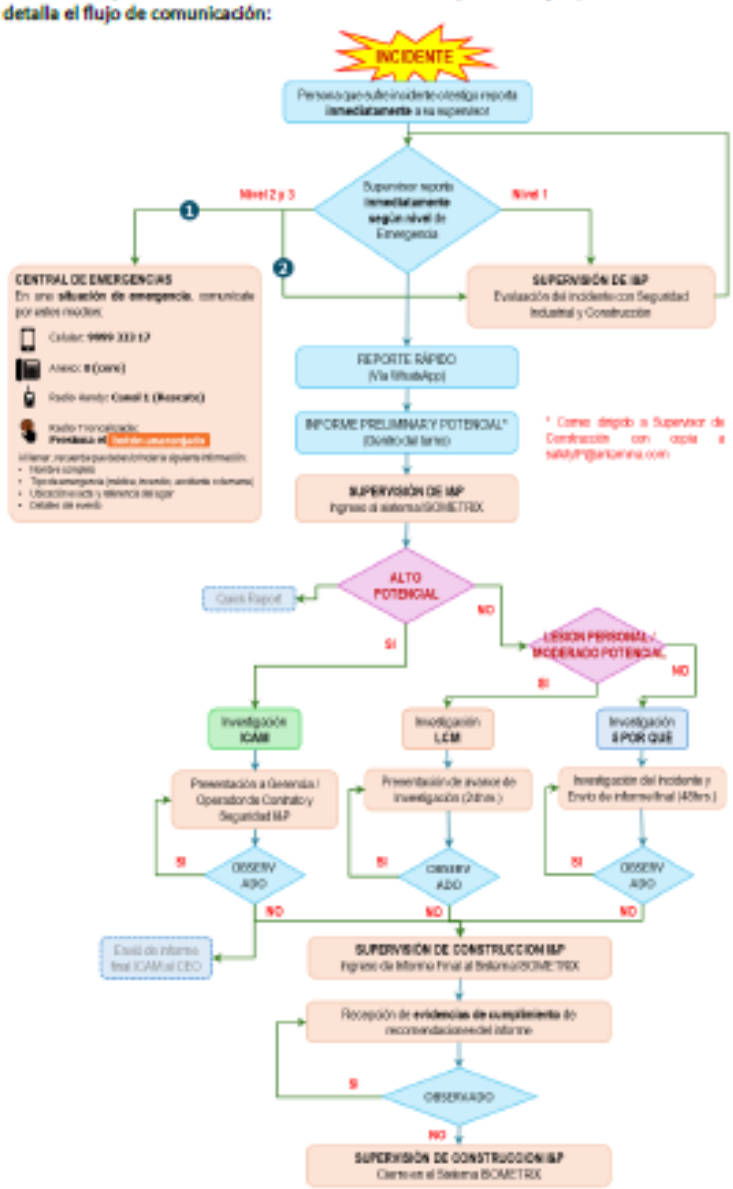

Referencias:

- GSSL-SIND-P001: Gestión de Incidentes y no conformidades de Seguridad Industrial.
- GSSL-SIM-G001: Guía para la Elaboración de Planes de Respuesta a Emergencias.

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

OHLA Perú	ENCUESTA DE AUTOEVALUACIÓN DIARIA DE FATIGA Y SOMNOLENCIA	CO-PE-1PE333-SS-IA-019 Revisión: 0 Fecha aprobación: 16/03/2026

Esta encuesta debe ser realizada por todos los conductores y operadores antes de iniciar su jornada.

Nombre del conductor / operador:

Turno: **Diurno ( )** **Nocturno ( )** **Fecha:**

Tipo de vehículo/equipo: **N° Celular:**

	PREGUNTAS DE AUTOEVALUACIÓN		SI	NO
1	*¿Ha dormido por 06 horas continuas como mínimo antes de iniciar su jornada? Si la respuesta es NO, explique por qué:*			
2	*¿Presenta alguno de los siguientes síntomas?:* 	*- Visión borrosa*		
		- Dificultad para concentrarse		
		- Escozor en ojos		
		- Pesadez en párpados		
		- Debilidad o falta de energía		
		- Bostezos frecuentes		
		- Deseo de dormir		
3	*¿Presenta algún malestar o se siente enfermo?*			
4	*¿Ha ingerido medicamentos durante el día u horas previas a su turno que produzcan sueño? (antigripales, jarabe para la tos, diazepam o similares)*			
5	*¿Se siente en condiciones adecuadas para conducir/operar?*			
6	*¿Consumió alcohol u otro tipo de sustancia prohibida en las últimas 24 horas?*			
7	*¿Reconoce dónde se encuentran los bebederos de agua en su frente de trabajo para mantenerse hidratado durante su jornada?*			

IMPORTANTE: Detenga toda actividad si presenta síntomas de fatiga o somnolencia y reporte inmediatamente a su Supervisor Operativo. En caso de **FATIGA** debe hidratarse y reactivarse con una pausa activa de 5 minutos en un lugar seguro. En caso de **SOMNOLENCIA** será conducido para realizar una parada de sueño de 25 minutos en un ambiente adecuado.

Conductor / Operador	Supervisor Operativo del Área
Firma	Firma

Comentarios:

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

RECETA PARA EL CUIDADO DE MANOS

APLÍCALO LAS 12 HORAS DE TRABAJO Y LOS 365 DÍAS DEL AÑO

1. Usa las herramientas correctas y en buen estado, en lugar de tus manos. Evalúa y utiliza protecciones adicionales como capuchones para cinceles, extensiones, etc.
2. Guarda las herramientas en sus estuches, en la caja o maletín de herramientas visibles, de tal forma que no lastimen tus manos al buscarlas. Asegúrate de que las herramientas estén inspeccionadas y en buen estado antes de ser usadas.
3. Identifica los puntos de fricción o atrapamiento de dedos y manos, y evita colocarlos en la línea de fuego. Utiliza los guantes adecuados (antiimpacto). Toma precaución al abrir o cerrar puertas y otros mecanismos, usando manijas.
4. No uses joyas en las manos ni ropa suelta durante los trabajos.
5. Protégete de bordes cortantes o filosos utilizando los guantes apropiados (anticorte). Si usas cuchillas u otras herramientas punzocortantes, hazlo en dirección contraria a tu cuerpo o a tus manos y utiliza guantes anticorte.
6. Usa los guantes adecuados cuando manipules sustancias químicas.
7. Evita tocar piezas, equipos o superficies con temperaturas extremas y, si fuera necesario, utiliza los guantes apropiados. Señaliza las superficies calientes y extremadamente frías.
8. Mantente alerta y ten cuidado al manipular o estar cerca de equipos con arranque automático. Verifica todas las condiciones de seguridad de dicho equipo.
9. Aplica el procedimiento de aislamiento, bloqueo y señalización. Asegúrate de liberar las energías residuales e identifica energías peligrosas que podrían liberarse antes de iniciar el mantenimiento, reparación, inspección o cambio de partes del equipo o sistema.
10. Utiliza cuerdas guías (vientos) y pértigas de izajeen la maniobra de izamiento de cargas o sistema non touch(sin contacto), y evita exponerte a la línea de fuego. No uses tus manos para guiar la carga.







ANTAMINA

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".
