Ausenco REVISIÓN AUSENCO
Código Interno: 108182-WH-P7001-606024-060
[ ] VALIDADO [ ] OBSERVADO
[X] INFORMATIVO [ ] ANULADO
Revisado por: _____ Fecha: _____
Firma: _____
Control Documentario
Recepcionado por: Lois Arce Fecha: 06/06/26
Hora: 18:40

OHLA Perú

PROYECTO: 25023

TAILINGS STORAGE FACILITIES PHASE IX

ETAPA: CONSTRUCCION – 105

4620003289

CRECIMIENTO PRESA DE RELAVES COTA 4180 - MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MANEJO DE AGUAS TSF SIDEHILL

PETS: ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE MATERIALES

105-25023-4620003289-PET-430-H-0044

VP: Portafolio de Proyectos

AFE: 25023

				OHLA Perú OSCAR IVAN GARCIA TALLEDO Jefe de SSOMA - CIP 196023 Fase IX y Sidehill	
00	31/05/2026	**Jefe de Calidad** Johan Lomparte	**Residente de Obra** Ricardo A. Echegaray Nuñez	**Jefe de SSOMA** Oscar Garcia	**Gerente de Proyecto** José M. Cabello Pacheco
Rev.	**Fecha**	**Elaborado Por**	**Revisado Por**	**Revisado Por**	**Aprobado Por**

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

Outlook

RE: Revisión de PETS Laboratorio de Calidad - OHLA Fase IX - PET-043 / 044 / 045

Desde Matos, Isaac <imatos@antamina.com>
Fecha Sáb 06/06/2026 7:18
Para Cabello Miranda, Arturo <acabello@antamina.com>; A_Portafolio Proy Safety <A_PortafolioProySafety@antamina.com>; Vásquez Portal, José <jvasquezp@antamina.com>
CC Macedo, Eder <eder.macedo@ausenco.com>; Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>; Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>; jmcabello@ohl.pe <jmcabello@ohl.pe>; Oscar Ivan Garcia Talledo <oscarivan.garcia@ohla-peru.pe>

No suele recibir correo electrónico de imatos@antamina.com. Por qué es esto importante

Conforme por seguridad

Favor de realizar el OPt inicial y enviar el registro

saludos

Isaac Matos Beramendi
Ingeniero Sr.de Seguridad Industrial
Gerencia de Seguridad Industrial
Compañía Minera Antamina S.A.
Telf. (511) 217-3000 Anx. 6978; Cell: 947629452
imatos@antamina.com
www.antamina.com

From: Cabello Miranda, Arturo <acabello@antamina.com>
Sent: Friday, June 5, 2026 9:14 AM
To: A_Portafolio Proy Safety <A_PortafolioProySafety@antamina.com>; Vásquez Portal, José <jvasquezp@antamina.com>; Matos, Isaac <imatos@antamina.com>
Cc: Macedo, Eder <eder.macedo@ausenco.com>; acastillo@ohla-peru.pe; Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>
Subject: FW: Revisión de PETS Laboratorio de Calidad - OHLA Fase IX - PET-043 / 044 / 045

Estimados:
Les agradecere su apoyo con la revision del PETS de Ohla.
Ya fue revisado por Ausenco y Construccion.

Saludos Cordiales

Arturo Cabello Miranda
Supervisor de Construcción
Vice Presidencia Ingeniería y Proyectos
Compañía Minera Antamina S.A.
Telf. (511) 217-3000 anexo 3158
Cel. (511) 945070333 - RPM #945070333
acabello@antamina.com
www.antamina.com

From: Eder Macedo <Eder.Macedo@ausenco.com>
Sent: Thursday, June 4, 2026 7:45 PM
To: Cabello Miranda, Arturo <acabello@antamina.com>
Cc: Manosalva Horna, Sandro <gmanosalva@antamina.com>; Llanos Barragan, Gilbert

<gllanos@antamina.com>; Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>; Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>; Miguel Angel Flores Siancas <miguel.flores@ohla-peru.pe>
Subject: RV: Revisión de PETS Laboratorio de Calidad - OHLA Fase IX - PET-043 / 044 / 045

Estimado @Cabello, Arturo buenas noches,

Su apoyo en continuar con el flujo de aprobación del siguiente PETs.

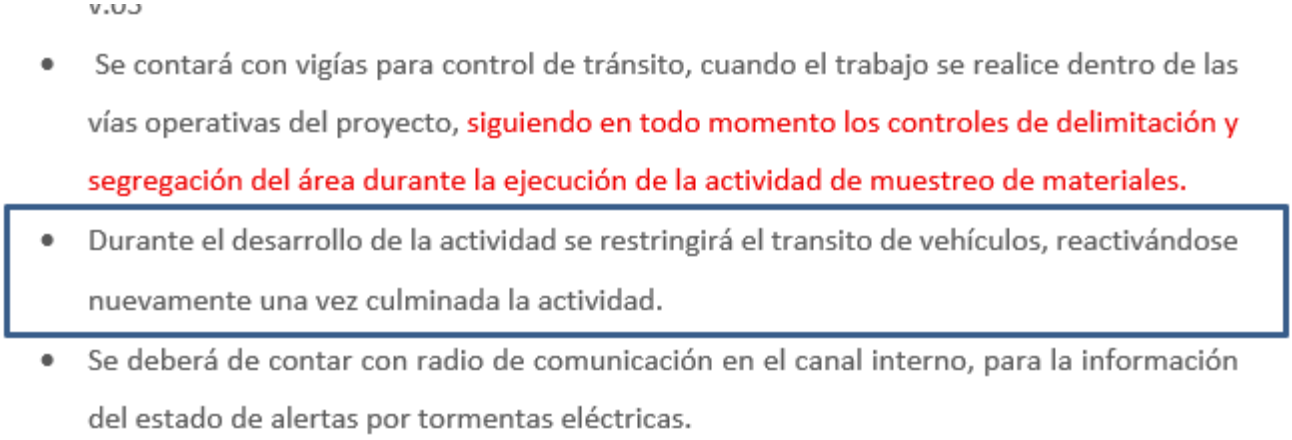
Las observaciones ya fueron superadas.

Saludos

Eder Macedo | Field Civil Engineer, Senior
Ausenco | ausenco.com

De: Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>
Enviado el: jueves, 4 de junio de 2026 16:34
Para: Jhanina Ordonez <Jhanina.Ordonez@ausenco.com>
CC: Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>; Miguel Angel Flores Siancas <miguel.flores@ohla-peru.pe>; Eder Macedo <Eder.Macedo@ausenco.com>; Llanos, Gilbert <gllanos@antamina.com>
Asunto: RE: Revisión de PETS Laboratorio de Calidad - OHLA Fase IX - PET-043 / 044 / 045

Eder/Jhanina buenas tardes, la observación si fue subsanada como un nuevo paso (párrafo) como se visualiza en la imagen:


v.03

- Se contará con vigías para control de tránsito, cuando el trabajo se realice dentro de las vías operativas del proyecto, siguiendo en todo momento los controles de delimitación y segregación del área durante la ejecución de la actividad de muestreo de materiales.
- Durante el desarrollo de la actividad se restringirá el transito de vehículos, reactivándose nuevamente una vez culminada la actividad.
- Se deberá de contar con radio de comunicación en el canal interno, para la información del estado de alertas por tormentas eléctricas.

Un saludo

OHLA Perú

Alan Castillo A.
Jefe de Calidad - Antamina
acastillo@ohla-peru.pe
Cel: 914340975
Obrascón Huarte Lain, SA - Sucursal del Perú

De: Jhanina Ordonez <Jhanina.Ordonez@ausenco.com>
Enviado: jueves, 4 de junio de 2026 6:33

Para: Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>
Cc: Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>; Miguel Angel Flores Siancas <miguel.flores@ohla-peru.pe>; Eder Macedo <Eder.Macedo@ausenco.com>; Llanos, Gilbert <gllanos@antamina.com>; Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>
Asunto: RE: Revisión de PETS Laboratorio de Calidad - OHLA Fase IX - PET-043 / 044 / 045

Estimado Alan buen dia;
Observaciones no fueron subsanadas,
Favor de verificar

Saludos;

Jhanina Ordonez | Field Civil Engineer, Intermediate
Ausenco | ausenco.com

De: Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>
Enviado el: martes, 2 de junio de 2026 17:46
Para: Jhanina Ordonez <Jhanina.Ordonez@ausenco.com>
CC: Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>; Miguel Angel Flores Siancas <miguel.flores@ohla-peru.pe>; Eder Macedo <Eder.Macedo@ausenco.com>; Jhanina Ordonez <Jhanina.Ordonez@ausenco.com>; Llanos, Gilbert <gllanos@antamina.com>
Asunto: RE: Revisión de PETS Laboratorio de Calidad - OHLA Fase IX - PET-043 / 044 / 045

Estimada Jhanina, se emite el documento PETs 45 atendiendo las observaciones, para su revisión

Un saludo

Alan Castillo A.
Jefe de Calidad - Antamina
acastillo@ohla-peru.pe
Cel: 914340975
Obrascón Huarte Lain, SA - Sucursal del Perú

De: Muñoz Cuenca, Henry Nestor <hmunoz@antamina.com>
Enviado: martes, 2 de junio de 2026 8:50
Para: Zarate Portilla, Jhonatan <jzarate@antamina.com>; A_Portafolio Proy Safety <A_PortafolioProySafety@antamina.com>
Cc: Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>; Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>; Miguel Angel Flores Siancas <miguel.flores@ohla-peru.pe>; Macedo, Eder <eder.macedo@ausenco.com>; Jhanina Ordonez <jhanina.ordonez@ausenco.com>; Llanos Barragan, Gilbert <gllanos@antamina.com>
Asunto: RE: Revisión de PETS Laboratorio de Calidad - OHLA Fase IX - PET-043 / 044 / 045

Estimado Jhonatan:

El status de los PETS es el siguiente:

PETS 043: Conforme

PETS 044: Conforme
PETS 045: Con Comentarios

Saludos,

Henry Muñoz Cuenca
Ingeniero de Seguridad Industrial
Vicepresidencia de Ingeniería y Proyectos
Compañía Minera Antamina S.A.
Telf. (511) 217-3000
Cel. 962663472
hmunoz@antamina.com
www.antamina.com

From: Zarate Portilla, Jhonatan <jzarate@antamina.com>
Sent: Monday, June 1, 2026 3:47 PM
To: Muñoz Cuenca, Henry Nestor <hmunoz@antamina.com>; A_Portafolio Proy Safety <A_PortafolioProySafety@antamina.com>
Cc: Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>; Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>; Miguel Angel Flores Siancas <miguel.flores@ohla-peru.pe>; Macedo, Eder <eder.macedo@ausenco.com>; Jhanina Ordonez <jhanina.ordonez@ausenco.com>; Llanos Barragan, Gilbert <gllanos@antamina.com>
Subject: RE: Revisión de PETS Laboratorio de Calidad - OHLA Fase IX - PET-043 / 044 / 045

Estimado Henry,
Por favor tu soporte con la revisión a los Pets adjuntos los cuales cuentan con las observaciones corregidas.

Gracias por el apoyo.

Saludos,
Jhonatan I. Zárate Portilla
Ingeniería & Proyectos
Compañia Minera Antamina S.A.
Telf. (511) 217- 3000 Anexo 6918
Cel. 945442032
jzarate@antamina.com
www.antamina.com

From: Jhanina Ordonez <Jhanina.Ordonez@ausenco.com>
Sent: Sunday, May 31, 2026 9:35 PM
To: Zarate Portilla, Jhonatan <jzarate@antamina.com>; Llanos Barragan, Gilbert <gllanos@antamina.com>
Cc: Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>; Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>; Miguel Angel Flores Siancas <miguel.flores@ohla-peru.pe>; Macedo, Eder <eder.macedo@ausenco.com>
Subject: RV: Revisión de PETS Laboratorio de Calidad - OHLA Fase IX - PET-043 / 044 / 045

Estimado Ing, Jhonatan

Buen dia

Se atendieron las observaciones de los siguientes PETS,

Favor su soporte con flujo revisión

- CO-PE-1PE333-PET-043_0 Secado de Muestras en Horno Eléctrico - Comentarios
- CO-PE-1PE333-PET-044_0 Análisis Granulométrico de Materiales
- CO-PE-1PE333-PET-045_0 Muestreo de Materiales

Saludos;

Jhanina Ordonez | Field Civil Engineer, Intermediate
Ausenco | ausenco.com

De: Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>
Enviado el: domingo, 31 de mayo de 2026 17:14
Para: Jhanina Ordonez <Jhanina.Ordonez@ausenco.com>; Eder Macedo <Eder.Macedo@ausenco.com>
CC: Miguel Angel Flores Siancas <miguel.flores@ohla-peru.pe>; Oscar Ivan Garcia Talledo <oscarivan.garcia@ohla-peru.pe>; Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>; Ayde Olibety Rada Fructus <ayde.rada@ohla-peru.pe>; Eduardo Antonio Castro Salgado <eduardo.castro@ohla-peru.pe>; Mario Eliseo Lopez Vega <mario.lopez@ohla-peru.pe>
Asunto: RV: Revisión de PETS Laboratorio de Calidad - OHLA Fase IX

Estimada Jhanina buenas tardes,

Envío PETS atendiendo los comentarios del Cliente, los cuales cuenta con la aprobación de nuestra área de seguridad.

- CO-PE-1PE333-PET-043_0 Secado de Muestras en Horno Eléctrico
- CO-PE-1PE333-PET-044_0 Análisis Granulométrico de Materiales
- CO-PE-1PE333-PET-045_0 Muestreo de Materiales

Favor tu soporte para su revisión
Saludos

Johan Lomparte C.
Jefe de Calidad

OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERU
Proyecto: "Fase IX Antamina - 1PE333"
Cel.: +51 920347119
johan.lomparte@ohla-peru.pe

De: Miguel Angel Flores Siancas <miguel.flores@ohla-peru.pe>
Enviado: domingo, 31 de mayo de 2026 16:50
Para: Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>; Oscar Ivan Garcia Talledo <oscarivan.garcia@ohla-peru.pe>
Cc: Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>; Mario Eliseo Lopez Vega <mario.lopez@ohla-peru.pe>; Ayde Olibety Rada Fructus <ayde.rada@ohla-peru.pe>
Asunto: RE: Revisión de PETS Laboratorio de Calidad - OHLA Fase IX

Estimados.

Conforme por SSO.

Saludos

Miguel Flores

De: Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>
Enviado el: domingo, 31 de mayo de 2026 16:46
Para: Miguel Angel Flores Siancas <miguel.flores@ohla-peru.pe>; Oscar Ivan Garcia Talledo <oscarivan.garcia@ohla-peru.pe>
CC: Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>; Mario Eliseo Lopez Vega <mario.lopez@ohla-peru.pe>; Ayde Olibety Rada Fructus <ayde.rada@ohla-peru.pe>
Asunto: RV: Revisión de PETS Laboratorio de Calidad - OHLA Fase IX

Estimado Miguel,

Envío PETS atendiendo los comentarios del Cliente, favor tu soporte para su revisión.

- CO-PE-1PE333-PET-043_0 Secado de Muestras en Horno Eléctrico
- CO-PE-1PE333-PET-044_0 Análisis Granulométrico de Materiales
- CO-PE-1PE333-PET-045_0 Muestreo de Materiales

Saludos

Johan Lomparte C.

Jefe de Calidad

OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERU

Proyecto: "Fase IX Antamina - 1PE333"

Cel.: +51 920347119

johan.lomparte@ohla-peru.pe

De: Muñoz Cuenca, Henry Nestor <hmunoz@antamina.com>
Enviado: domingo, 31 de mayo de 2026 8:43
Para: Zarate Portilla, Jhonatan <jzarate@antamina.com>; A_Portafolio Proy Safety <A_PortafolioProySafety@antamina.com>

Cc: Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>; Ayde Olibety Rada Fructus <ayde.rada@ohla-peru.pe>; Mario Eliseo Lopez Vega <mario.lopez@ohla-peru.pe>; Antonio Ramos Nuñez <aramos@ohla-peru.pe>; Raul Francisco Achachau Ayquipa <raul.achachau@ohla-peru.pe>; Eduardo Antonio Castro Salgado <eduardo.castro@ohla-peru.pe>; Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>; Eder Macedo <eder.macedo@ausenco.com>; Victor Zavaleta <victor.zavaleta@ausenco.com>; Erick Ortiz <erick.ortiz@ausenco.com>; Jhanina Ordonez <jhanina.ordonez@ausenco.com>; Llanos Barragan, Gilbert <gllanos@antamina.com>
Asunto: RE: Revisión de PETS Laboratorio de Calidad - OHLA Fase IX

Estimado Jhonatan:

PETS con comentarios.

Saludos,

Henry Muñoz Cuenca

Ingeniero de Seguridad Industrial

Vicepresidencia de Ingeniería y Proyectos

Compañía Minera Antamina S.A.

Telf. (511) 217-3000

Cel. 962663472

hmunoz@antamina.com

www.antamina.com

From: Zarate Portilla, Jhonatan <jzarate@antamina.com>
Sent: Saturday, May 30, 2026 9:41 PM
To: Muñoz Cuenca, Henry Nestor <hmunoz@antamina.com>; A_Portafolio Proy Safety <A_PortafolioProySafety@antamina.com>; A_Safety Ingenieria y Proyectos <safetyip@antamina.com>
Cc: Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>; Ayde Olibety Rada Fructus <ayde.rada@ohla-peru.pe>; Mario Eliseo Lopez Vega <mario.lopez@ohla-peru.pe>; Antonio Ramos Nuñez <aramos@ohla-peru.pe>; Raul Francisco Achachau Ayquipa <raul.achachau@ohla-peru.pe>; Eduardo Antonio Castro Salgado <eduardo.castro@ohla-peru.pe>; Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>; Macedo, Eder <eder.macedo@ausenco.com>; Zavaleta, Victor <victor.zavaleta@ausenco.com>; Erick Ortiz <erick.ortiz@ausenco.com>; Jhanina Ordonez <jhanina.ordonez@ausenco.com>; Llanos Barragan, Gilbert <gllanos@antamina.com>
Subject: RE: Revisión de PETS Laboratorio de Calidad - OHLA Fase IX

Estimado Henry,

Por favor tu soporte con la revisión de los Pets adjuntos.

Gracias por el apoyo.

Saludos,

Jhonatan I. Zárate Portilla

Ingeniería & Proyectos

Compañia Minera Antamina S.A.

Telf. (511) 217- 3000 Anexo 6918

Cel. 945442032

jzarate@antamina.com

www.antamina.com

From: Jhanina Ordonez <Jhanina.Ordonez@ausenco.com>
Sent: Friday, May 29, 2026 4:37 PM
To: Zarate Portilla, Jhonatan <jzarate@antamina.com>; Llanos Barragan, Gilbert <gllanos@antamina.com>
Cc: Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>; Ayde Olibety Rada Fructus <ayde.rada@ohla-peru.pe>; Mario Eliseo Lopez Vega <mario.lopez@ohla-peru.pe>; Antonio Ramos Nuñez <aramos@ohla-peru.pe>; Raul Francisco Achachau Ayquipa <raul.achachau@ohla-peru.pe>; Eduardo Antonio Castro Salgado <eduardo.castro@ohla-peru.pe>; Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>; Macedo, Eder <eder.macedo@ausenco.com>; Zavaleta, Victor <victor.zavaleta@ausenco.com>; Erick Ortiz <erick.ortiz@ausenco.com>
Subject: RE: Revisión de PETS Laboratorio de Calidad - OHLA Fase IX

Estimado Ing, Jhonatan

Buen dia

Favor su acostumbrado apoyo con el flujo revisión del siguiente PETS, Asociados a trabajos en Planta de Asfalto

- CO-PE-1PE333-PET-043_0 Secado de Muestras en Horno Eléctrico - Comentarios
- CO-PE-1PE333-PET-044_0 Análisis Granulométrico de Materiales
- CO-PE-1PE333-PET-045_0 Muestreo de Materiales

Saludos;

Jhanina Ordonez | Field Civil Engineer, Intermediate
Ausenco | ausenco.com

De: Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>
Enviado el: viernes, 29 de mayo de 2026 08:55
Para: Jhanina Ordonez <Jhanina.Ordonez@ausenco.com>; Eder Macedo <Eder.Macedo@ausenco.com>
CC: Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>; Ayde Olibety Rada Fructus <ayde.rada@ohla-peru.pe>; Mario Eliseo Lopez Vega <mario.lopez@ohla-peru.pe>; Antonio Ramos Nuñez <aramos@ohla-peru.pe>; Raul Francisco Achachau Ayquipa <raul.achachau@ohla-peru.pe>; Eduardo Antonio Castro Salgado <eduardo.castro@ohla-peru.pe>
Asunto: RV: Revisión de PETS Laboratorio de Calidad - OHLA Fase IX

Estimada Jhanina buen día,

Se envía PETS adjunto atendiendo los comentarios realizados. Cabe mencionar que este documento cuenta con la revisión y validación de nuestra área de seguridad.

Saludos

Johan Lomparte C.

Jefe de Calidad

OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERU

Proyecto: "Fase IX Antamina - 1PE333"

Cel.: +51 920347119

johan.lomparte@ohla-peru.pe

De: Miguel Angel Flores Siancas <miguel.flores@ohla-peru.pe>
Enviado: viernes, 29 de mayo de 2026 8:37
Para: Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>
Cc: Jose Miguel Cabello Pacheco <jmcabello@ohla-peru.pe>; Oscar Ivan Garcia Talledo <oscarivan.garcia@ohla-peru.pe>; Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>; Ayde Olibety Rada Fructus <ayde.rada@ohla-peru.pe>; Mario Eliseo Lopez Vega <mario.lopez@ohla-peru.pe>
Asunto: RE: Revisión de PETS Laboratorio de Calidad - OHLA Fase IX

Estimado Johan.

Conforme por SSO

Saludos

Miguel Flores

De: Jhanina Ordonez <Jhanina.Ordonez@ausenco.com>
Enviado el: jueves, 28 de mayo de 2026 20:56
Para: Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>; Eder Macedo <Eder.Macedo@ausenco.com>
CC: Jose Miguel Cabello Pacheco <jmcabello@ohla-peru.pe>; Miguel Angel Flores Siancas <miguel.flores@ohla-peru.pe>; Oscar Ivan Garcia Talledo <oscarivan.garcia@ohla-peru.pe>; Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>; Ayde Olibety Rada Fructus <ayde.rada@ohla-peru.pe>; Mario Eliseo Lopez Vega <mario.lopez@ohla-peru.pe>; Ronald Ortiz <Ronald.Ortiz@ausenco.com>; Eder Macedo <Eder.Macedo@ausenco.com>
Asunto: RE: Revisión de PETS Laboratorio de Calidad - OHLA Fase IX

CORREO EXTERNO: Comprueba el remitente y no pulses los enlaces ni los adjuntos si dudas que sean seguros.
EXTERNAL EMAIL: Check the sender and do not click any link or attachment unless you are sure they are safe.

Estimado Johan

Se remite Pets con comentarios 2/4

- CO-PE-1PE333-PET-043_0 Secado de Muestras en Horno Eléctrico - Comentarios
- CO-PE-1PE333-PET-044_0 Análisis Granulométrico de Materiales

Saludos;

Jhanina Ordonez | Field Civil Engineer, Intermediate
Ausenco | ausenco.com

De: Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>
Enviado el: miércoles, 27 de mayo de 2026 18:15
Para: Eder Macedo <Eder.Macedo@ausenco.com>; Jhanina Ordonez <Jhanina.Ordonez@ausenco.com>
CC: Jose Miguel Cabello Pacheco <jmcabello@ohla-peru.pe>; Miguel Angel Flores Siancas <miguel.flores@ohla-peru.pe>; Oscar Ivan Garcia Talledo <oscarivan.garcia@ohla-peru.pe>; Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>; Ayde Olibety Rada Fructus <ayde.rada@ohla-peru.pe>; Mario Eliseo Lopez Vega <mario.lopez@ohla-peru.pe>
Asunto: RV: Revisión de PETS Laboratorio de Calidad - OHLA Fase IX

Estimado Eder,

En adjunto podrás encontrar los siguientes PETS para revisión, los cuales están revisados por nuestra área de seguridad.

- CO-PE-1PE333-PET-043_0 Secado de Muestras en Horno Eléctrico.
- CO-PE-1PE333-PET-044_0 Análisis Granulométrico de Materiales
- CO-PE-1PE333-PET-045_0 Muestreo de Materiales
- CO-PE-1PE333-PET-061_0 Controles de Concreto Fresco

Saludos

Johan Lomparte C.

Jefe de Calidad

OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERU

Proyecto: "Fase IX Antamina - 1PE333"

Cel.: +51 920347119

johan.lomparte@ohla-peru.pe

De: Miguel Angel Flores Siancas <miguel.flores@ohla-peru.pe>
Enviado: miércoles, 27 de mayo de 2026 17:57
Para: Ayde Olibety Rada Fructus <ayde.rada@ohla-peru.pe>; Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>; Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>
Cc: Jose Miguel Cabello Pacheco <jmcabello@ohla-peru.pe>; Antonio Ramos Nuñez <aramos@ohla-peru.pe>; Israel Hernandez Zuñiga <israel.hernandez@ohla-peru.pe>; Cristian Cueto Anuarbe <ccueto@ohla-peru.pe>; Ricardo Alonso Echegaray Nuñez <rechegaray@ohla-peru.pe>; Oscar Ivan Garcia Talledo <oscarivan.garcia@ohla-peru.pe>
Asunto: RE: Revision de Pets

Estimados.

Adjunto los 04 PETS con mis aportaciones en rojo.

- CO-PE-1PE333-PET-043_0 Secado de Muestras en Horno Eléctrico.
- CO-PE-1PE333-PET-044_0 Análisis Granulométrico de Materiales
- CO-PE-1PE333-PET-045_0 Muestreo de Materiales
- CO-PE-1PE333-PET-061_0 Controles de Concreto Fresco

Con ello quedaría conforme por SSO.

Saludos

OHLA Perú

Miguel A. Flores Siancas

JEFE SSO – OBRA ANTAMINA

FASE IX Y SIDEHILL

Avenida 28 de Julio 150 - Piso 7, Miraflores

T. (+51) 966121649

Lima - Perú

www.ohla-group.com

De: Ayde Olibety Rada Fructus <ayde.rada@ohla-peru.pe>
Enviado el: miércoles, 27 de mayo de 2026 10:49
Para: Miguel Angel Flores Siancas <miguel.flores@ohla-peru.pe>
CC: Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>; Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>
Asunto: Revision de Pets

Estimado ing

Adjunto los siguiente PET para su revisión

Saludos

Ayde Rada

La información contenida en este e-mail es confidencial, privilegiada y está dirigida exclusivamente a su destinatario. Cualquier revisión, difusión, distribución o copiado de este mensaje está prohibido. Si ha recibido este e-mail por error por favor bórrelo y envíe un mensaje al remitente.

The information contained in this e-mail is privileged and confidential and is intended only for its addressee. Any review, dissemination, distribution or copying of this e-mail is prohibited. If you have received it in error please delete the original message and e-mail us.

La información contenida en este e-mail es confidencial, privilegiada y está dirigida exclusivamente a su destinatario. Cualquier revisión, difusión, distribución o copiado de este mensaje está prohibido. Si ha recibido este e-mail por error por favor bórrelo y envíe un mensaje al remitente.

The information contained in this e-mail is privileged and confidential and is intended only for its addressee. Any review, dissemination, distribution or copying of this e-mail is prohibited. If you have received it in error please delete the original message and e-mail us.

La información contenida en este e-mail es confidencial, privilegiada y está dirigida exclusivamente a su destinatario. Cualquier revisión, difusión, distribución o copiado de este mensaje está prohibido. Si ha recibido este e-mail por error por favor bórrelo y envíe un mensaje al remitente.

The information contained in this e-mail is privileged and confidential and is intended only for its addressee. Any review, dissemination, distribution or copying of this e-mail is prohibited. If you have received it in error please delete the original message and e-mail us.

CO - PE - 1PE333 - SS - PE - 044

PETS: Análisis granulométrico de materiales

Preparado por	Revisado por	Revisado por	Aprobado por
Jefe de Calidad	Residente de obra	Jefe de SSOMA	Gerente de proyecto
Johan Lomparte 31/05/2026	Ricardo A. Echegaray Nuñez 31/05/2026	Oscar Garcia, 31/05/2026	Jose M. Cabello Pacheco, 31/05/2026

Nivel de seguridad:
Uso interno

Alcance:
FASE IX 4180 ANTAMINA

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

Histórico de revisiones

Rev.00	31/05/2026	Creación del documento

Documentación relacionada y aplicable

ISO 45001	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
----	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADA SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD
-----	REQUISITOS LEGALES VIGENTES
D.S 024-2016-EM	REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN MINERIA
D.S 023-2027-EM	Modificatoria del D.S-024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en minería

Definiciones

NA

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

Matriz del Conocimiento

CATEGORÍA	FUNCIONES
☐ Todas las categorías	☐ Todas las funciones
☐ Consejero delegado	☐ Asesoría Jurídica
☐ Directores Generales	☐ Económico Financiera
☐ Dirección General	☐ Organización
☐ Director Corporativo	☐ RR.HH y SSGG
☐ Director	☐ Sistemas de Información
☐ Jefe Corporativo de	☐ Soporte Corporativo
☒ Jefe de Producción	☒ Soporte Técnico
☒ Técnico	☐ Línea/Producción
☐ Especialista	☐ Otros:……
☐ Administrativo	
☒ Operario cualificado	

Responsable de distribución: Responsable de Construcción

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

ÍNDICE

1.1. Gerente de Proyecto. 6
1.2. Ingeniero de Seguridad y Salud en el trabajo 6
1.3. Jefe de laboratorio 6
1.4. Supervisor de Calidad 7
1.5. Técnico de Laboratorio 7
1.6. Auxiliares de Laboratorio 8
2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 8
3. EQUIPO / HERRAMIENTAS / MATERIALES 9
3.1 Equipos 9
3.2 Herramientas 9
3.3 Material 9
4.1 Consideraciones generales 9
4.2 Tamizado (Análisis Granulométrico) 11
5. RESTRICCIONES 13
6. ANEXOS 13

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

1. PERSONAL

1.1. Gerente de Proyecto.

- Asignar y garantizar los recursos para el cumplimento de las actividades relacionadas al presente procedimiento.
- Responsable de la planificación, programación y seguimiento de las actividades y responsable del cumplimiento del presente procedimiento siguiendo las normas de seguridad.
- Verificar la implementación de los controles para los riesgos críticos identificadas para la tarea.
- Supervisar la correcta ejecución de las actividades de obra, según lo establecido en el presente procedimiento.
- Comprometerse con la prevención de incidentes, lesiones y enfermedades ocupacionales, promoviendo la participación de los trabajadores en el desarrollo e implementación de actividades de Seguridad y Salud Ocupacional.
- Cumplir y hacer cumplir las 10 reglas por la vida estipuladas por Antamina.

1.2. Ingeniero de Seguridad y Salud en el trabajo

- Auditar y asesorar el llenado y cumplimiento de las autorizaciones (permisos) de trabajo e IPERC CONTINUO y PETAR que apliquen a la actividad.
- Difundir a todo el personal involucrado el presente PETS una vez aprobado para su estricto cumplimiento en campo y generar la OPT de inicio de actividades.
- Cumplir las obligaciones según el Art 38 “Obligaciones de los supervisores” del DS 024-2016-EM y su modificatoria DS 023-2017.
- Revisar y firmar el IPERC-Continuo de la tarea, asegurándose del cumplimiento de las medidas de control establecidas.
- Inspeccionar aleatoriamente los trabajos, verificando el cumplimiento del procedimiento.
- Verificar y evaluar que el personal involucrado conozca el procedimiento de trabajo seguro.
- Verificar que el personal cuente con las autorizaciones requeridas para el trabajo.
- Reportar incidentes y accidentes de forma inmediata.
- Asegurar que solo el personal entrenado, capacitado y autorizado realice las actividades planificadas.
- Reportar todo incidente y accidente según el canal de comunicación en flujograma de comunicación de incidentes.

1.3. Jefe de laboratorio

- Difundir, aplicar y hacer cumplir el presente procedimiento.
- Asegurar que sólo personal entrenado, certificado y autorizado opere equipos.

“Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida”.

- Proporcionar los recursos necesarios para la ejecución de los trabajos.
- Difundir y verificar que el personal involucrado conozca el presente procedimiento y hacer seguimiento de su cumplimiento.
- Usar permanentemente y de forma correcta los EPPs, así como darles el cuidado necesario.
- Parar inmediatamente el trabajo si las condiciones de este atentan contra la seguridad del personal involucrado o terceros.
- Participar activamente en la detección de posibles desviaciones, actos inseguros, condiciones inseguras, entre otras observaciones realizadas en el terreno de trabajo, lo cual deberá ser reportado oportunamente al Supervisor de Área SSOMA.
- Reportar incidentes de forma inmediata a su supervisor inmediato.

1.4. Supervisor de Calidad

- Difundir, aplicar y hacer cumplir el presente procedimiento.
- Asegurar que sólo personal entrenado, certificado y autorizado opere equipos.
- Proporcionar los recursos necesarios para la ejecución de los trabajos.
- Parar inmediatamente el trabajo si las condiciones de este atentan contra la seguridad del personal involucrado o terceros.
- Usar permanentemente y de forma correcta los EPPs, así como darles el cuidado necesario.
- Participar activamente en la detección de posibles desviaciones, actos inseguros, condiciones inseguras, entre otras observaciones realizadas en el terreno de trabajo, lo cual deberá ser reportado oportunamente al Supervisor de Área SSOMA.
- Reportar inmediatamente cualquier incidente o accidente.

1.5. Técnico de Laboratorio

- Conocer y cumplir el presente procedimiento.
- Participar en la elaboración del IPERC continuo (identificación de peligros, evaluación de riesgos, y controles).
- Realizar el check list de pre-uso de los equipos y herramientas a utilizar, y de presentar algún desperfecto o falla, reportarlo y/o asignarle la tarjeta de fuera de servicio.
- Usar permanentemente y de forma correcta los EPPs, así como darles el cuidado necesario.
- Respetar la restricción de ingreso a las áreas señalizadas y delimitadas.
- Identificar puntos de atricción de manos y señalizar.

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

- Durante la realización de los trabajos aplicar la receta para el cuidado de manos, priorizando la N° 3 y N° 5.
- Consultar al supervisor sobre cualquier duda en la realización del trabajo.
- Reportar inmediatamente cualquier incidente o accidente.

1.6. Auxiliares de Laboratorio

- Conocer y cumplir el presente procedimiento.
- Participar en la elaboración del IPERC continuo (identificación de peligros, evaluación de riesgos, y controles).
- Realizar el check list de pre-uso de los equipos y herramientas a utilizar, y de presentar algún desperfecto o falla, reportarlo y/o asignarle la tarjeta de fuera de servicio.
- Mantener el área limpia y ordenada
- Usar permanentemente y de forma correcta los EPPs, así como darles el cuidado necesario.
- Respetar la restricción de ingreso a las áreas señalizadas y delimitadas.
- Identificar puntos de atricción de manos y señalizar.
- Durante la realización de los trabajos aplicar la receta para el cuidado de manos, priorizando la N° 3 y N° 5.
- Consultar al supervisor sobre cualquier duda en la realización del trabajo.
- Reportar inmediatamente cualquier incidente o accidente.

2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

- Casco de Seguridad.
- Lentes de Seguridad.
- Zapatos de Seguridad.
- Chaleco Reflectivo.
- Bloqueador solar - FPS mayor o igual a 50.
- Protección auditiva - ANSI S3.19-1974.
- Ropa protectora – ANSI/ISEA 107-2005 (Elementos reflectantes para EPP).
- Respirador de media cara con Filtro 3M 7093C para partículas P100.
- Guante anticorte

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

- Guantes aluminizados de caña alta.
- Mandil aluminizado
- Guantes de jebe
- Careta de protección facial

3. EQUIPO / HERRAMIENTAS / MATERIALES

3.1 Equipos

- Camioneta 4 x 4.
- Detector de tormentas portátil con batería adicional
- Radio portátil (Troncalizada y canal interno) con Batería de repuesto

3.2 Herramientas

- Balanza.
- Horno de secado.
- Kit de tamices.
- Depósitos adecuados (tazones y bandejas de acero galvanizado y aluminio) para el manejo y secado de muestras.
- Cepillo y Brocha.
- Kit de emergencias.

3.3 Material

- Muestras de agregados
- Muestras de suelos.

4. PROCEDIMIENTO

4.1 Consideraciones generales

- Todo el personal debe asistir a las reuniones de seguridad previas al inicio de las labores (Charla de 5 minutos).

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

- Se realizará el IPERC-Continuo en el área de trabajo con la participación de todo el personal involucrado en esta tarea, inspeccionando el área de trabajo, e implementando los controles según los peligros y riesgos encontrados.
- El supervisor de operaciones debe verificar la elaboración, firmar, autorizar el inicio de tarea y que se mantenga el IPERC en el frente de trabajo hasta el término de jornada.
- Las herramientas para utilizar deben encontrarse inspeccionadas (operativas), con la identificación correspondiente a la cinta de color del mes para ejecutar la actividad, si se reporta fallas no realizar la reparación de estas y eliminarlas del área de trabajo.

ROJO	ENERO-MARZO
AZUL	ABRIL-JUNIO
AMARILLO	JULIO-SETIEMBRE
NEGRO	OCTUBRE-DICIEMBRE

Imagen 1 – Identificación de cinta de color del mes

- Todo el personal involucrado en la tarea, inspeccionando el área de trabajo, e implementando los controles según los peligros y riesgos encontrados.
- El supervisor debe verificar las condiciones del área de descarga antes de iniciar las labores y al intermedio.
- Verificar la disponibilidad de Equipos de Protección Personal (EPPs) y herramientas requeridas para cumplir el presente procedimiento. Antes de iniciar y durante toda la actividad se deberá usar estrictamente los EPPs, con la finalidad de minimizar los riesgos que puedan afectar a la persona.
- La iluminación en el lugar de trabajo (Laboratorio) deberá ser la adecuada manteniendo un nivel de iluminación de 500 – 700 lux. Esto permitirá de tal forma que no sea un factor de riesgo para la salud y seguridad de los trabajadores al realizar sus labores.
- Las herramientas para utilizar deben encontrarse inspeccionadas (operativas), con la identificación correspondiente a la cinta de color del mes para ejecutar la actividad, si se reporta fallas realizar la reparación de estas y/o eliminarlas del área de trabajo.
- El personal debe tener difusión en la receta de cuidado de manos y línea de fuego.
- El supervisor deberá aplicar los controles críticos relacionado al trabajo:

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

- RC 23 - Descarga atmosférica (rayos) y/o trabajos en zonas remotas.
  - Uso de EPP específicos en áreas remotas
  - Calibración y mantenimiento de equipos fijos y portátiles
  - Capacitación del personal en detección visual de tormentas eléctricas, niveles de alerta, uso de refugios y detectores portátiles.
  - Refugios certificados y señalizados en zonas de trabajo expuestas
  - Sistema de comunicación radial y protocolos de comunicación
  - Verificación previa de condiciones meteorológicas y operativas
  - Brigadas de respuesta a emergencia (Comunicación, equipamiento y competencia)
  - Pararrayos en áreas expuestas a descargas atmosféricas

- El supervisor verificará los controles críticos para los riesgos críticos relacionados con las actividades a ejecutar en el presente procedimiento.
- El personal deberá realizar la identificación y evaluación de peligros mecánicos, tales como puntos de atrapamiento, puntos de atrición, zonas de cizallamiento y superficies cortantes. Evitando en todo momento la exposición de las manos y utilizando los elementos de protección personal adecuados como guantes anti impactó y anticorte.
- Todo personal debe estar capacitado en respuesta a emergencias y uso de extintores
- Se debe contar en el área con un detector portátil de tormentas, operado por personal capacitado por el proveedor, así como con una batería de repuesto disponible.

4.2 Tamizado (Análisis Granulométrico)

- Señalizar el área de trabajo donde se realizará el tamizado.
- Durante el ensayo solo se permite personal autorizado.
- El horno de secado deberá contar con un check list (Anexo 01) para verificar el estado operativo, los cables no deben tener empalmes y los puntos de conexión deben estar identificados y señalizados.
- El horno deberá encenderse y calibrar la temperatura sugerida de 110°C. El equipo debe estar señalizado con señalética de superficie caliente. Durante este proceso el personal deberá contar con un extintor vigente, inspeccionado y operativo (El personal deberá contar con capacitación en amago de incendio)

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

- La muestra representativa de la masa del suelo se introduce al horno en un recipiente tipo bandejas con asas (máximo tamaño de bandejas a utilizar es de 1 m x 0.60 m con un peso máximo sin muestra de 3.5 kg), utilizando guantes aluminizado de caña larga, mandil aluminizado y careta de protección facial, siguiendo los lineamientos del documento PETS CO-PE-1PE333-PET-043_0 Secado de Muestras en Horno Eléctrico. El peso permitido para cargar muestras para una persona es de 25 kg para hombres y 15 kg para mujeres.



Imagen 2 - Bandejas con asas para muestras de agregados

- Después que la muestra ha sido secada en el horno (110 °C ± 5 °C) se retira utilizando siempre el mandil aluminizado y los guantes aluminizados de caña alta para luego dejarlo enfriar a temperatura ambiente en la mesa de trabajo respectivamente señalizada y rotulada, hasta alcanzar una temperatura de 25 °C, el cual será medido con un termómetro calibrado.
- El material se vierte en los tamices dispuestos sucesivamente de mayor a menor, colocando un receptáculo denominado fondo, durante 10 minutos, siempre utilizando el EPP correspondiente (respirador doble vía cara con Filtro 7093C para partículas P100, lentes, protector de oídos, guantes anticorte y/o badana), el técnico de laboratorio mantendrá una postura con la espalda erguida, con una posición de 90° con respecto al suelo, para no presentar problemas disergonómicos. El personal identificará superficies filosas y puntos de atrición, y el personal no expondrá las manos.

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

- Se procede a pesar el material retenido en cada tamiz, utilizando guantes anticorte, y se registra los datos.
- El suelo que se encuentra en el fondo de los tamices se pesa, se lava sobre el tamiz N° 200, utilizando guantes de jebe.
- La nueva muestra obtenida se coloca en el horno a una temperatura de 110 °C ± 5 °C, con lo cual el personal técnico utilizará en todo momento el mandil aluminizado y los guantes aluminizados de caña larga, siguiendo los lineamientos del PETS CO-PE-1PE333-PET-043_0 Secado de Muestras en Horno Eléctrico.
- Se retira la muestra del horno, se deja enfriar verificando la temperatura con un termómetro, luego procediendo a realizar el pesado del mismo.
- Se registra los datos para cálculos del ensayo.
- Se apaga el equipo y se desconecta.
- Se realiza orden y limpieza del área de trabajo.

5. RESTRICCIONES

- No se iniciarán los trabajos si el personal involucrado no ha recibido la difusión del presente PETS.
- No se iniciarán los trabajos si no se cuenta con el IPERC y el Pre-uso del equipo a utilizar.
- No se iniciará el trabajo si no se cuenta con el EPP adecuado para este trabajo.
- No se iniciará el trabajo si el equipo presenta desperfectos o fallas mecánicas y sin certificado de calibración.
- Está prohibido el uso de celulares durante la ejecución de las actividades.
- De ocurrir cualquier incidente, se deberá parar las actividades y reportar al Supervisor OHLA, Ausenco y Antamina.
- El trabajador tiene toda la potestad de negarse ante un trabajo inseguro.
- No se ejecutarán los trabajos si no se aplican los controles críticos del RC-23 Caída De Rayos - Tormentas Eléctricas.

6. ANEXOS

- Anexo 01 – Check List de Horno eléctrico
- Anexo 02 – Receta para el cuidado de manos

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

OHLA Perú	CHECK LIST DE HORNO ELÉCTRICO	CO-PE-1PE333-SS-IA-057
		Revisión: 0
		Fecha aprobación: 28/03/2026

PROYECTO:	"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MANEJO DE AGUAS TSF/SIDEHILL EJECUCIÓN FASE IX"			
NOMBRE DE TAREA:				
FECHA:		ÁREA DE TRABAJO:		
ITEM	INSPECCIONES	SI	NO	OBSERVACIONES
1	HORNO SE CUENTRA LIMPIO.			
2	LAS COMPUERTAS DEL HORNO ESTAN EN BUEN ESTADO.			
3	LOS CABLES Y ENCHUFES SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO.			
4	LAS DIVISIONES Y TECHO INTERNO SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO.			
5	EL CONTROLADOR DE TEMPERATURA FUNCIONA CORRECTAMENTE			
6	CUENTA CON TUBO DE ESCAPE DE VAPORES EN BUEN ESTADO			

INSPECCIONADO:	SUPERVISOR DE ÁREA:
NOMBRES Y APELLIDOS:	NOMBRES Y APELLIDOS:
FECHA:	FECHA:

RECOMENDACIONES:
Siempre desconecte el equipo cuando no esté utilizando.
No retire el equipo la guardia de protección.
No realizar trabajos sobre superficie húmedas.
Retire todo material combustible del área.
No utilice la herramienta si no cuenta con la autorización de herramienta de poder.

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

RECETA PARA EL CUIDADO DE MANOS

APLÍCALO LAS 12 HORAS DE TRABAJO Y LOS 365 DÍAS DEL AÑO

1. Usa las herramientas correctas y en buen estado, en lugar de tus manos. Evalúa y utiliza protecciones adicionales como capuchones para cinceles, extensiones, etc.
2. Guarda las herramientas en sus estuches, en la caja o maletín de herramientas visibles, de tal forma que no lastimen tus manos al buscarlas. Asegúrate de que las herramientas estén inspeccionadas y en buen estado antes de ser usadas.
3. Identifica los puntos de fricción o atrapamiento de dedos y manos, y evita colocarlos en la línea de fuego. Utiliza los guantes adecuados (antiimpacto). Toma precaución al abrir o cerrar puertas y otros mecanismos, usando manijas.
4. No uses joyas en las manos ni ropa suelta durante los trabajos.
5. Protégete de bordes cortantes o filosos utilizando los guantes apropiados (anticorte). Si usas cuchillas u otras herramientas punzocortantes, hazlo en dirección contraria a tu cuerpo o a tus manos y utiliza guantes anticorte.
6. Usa los guantes adecuados cuando manipules sustancias químicas.
7. Evita tocar piezas, equipos o superficies con temperaturas extremas y, si fuera necesario, utiliza los guantes apropiados. Señaliza las superficies calientes y extremadamente frías.
8. Mantente alerta y ten cuidado al manipular o estar cerca de equipos con arranque automático. Verifica todas las condiciones de seguridad de dicho equipo.
9. Aplica el procedimiento de aislamiento, bloqueo y señalización. Asegúrate de liberar las energías residuales e identifica energías peligrosas que podrían liberarse antes de iniciar el mantenimiento, reparación, inspección o cambio de partes del equipo o sistema.
10. Utiliza cuerdas guías (vientos) y pértigas de izajeen la maniobra de izamiento de cargas o sistema non touch(sin contacto), y evita exponerte a la línea de fuego. No uses tus manos para guiar la carga.







ANTAMINA

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".
